

SONGHYEON BID PROJECT

송현 BID 방향성 및 실행계획

2026. 08

IGIS Asset Management

Executive Summary

개요	본 보고서는 시장·고객·크레딧 패러다임의 구조적 변화에 대응한 이지스의 회사 차원 방향성을 바탕으로, 송현 BID 프로젝트의 추진방향과 현장 실증을 위한 실행계획을 제시하기 위해 작성되었습니다.
배경	단일 프라퍼티의 물리적 매력도를 높이는 것만으로는 변화한 국내외 투자수요에 충분히 대응하기 어렵습니다. 투자수요는 기존의 Core-Value-add 등 전통적인 분류를 넘어 수요·계약·운영·전환 가능성을 함께 검토하는 방향으로 변화하고 있습니다. 송현 BID는 이러한 회사의 방향성에 부합하며, 구역 단위의 장소·서비스·운영 역량을 실제 현장에서 검토하는 실행과제입니다.
전략 가설	본 보고서는 먼저 송현 BID 프로젝트의 전략적 배경과 프로젝트의 기본 가설을 정립하고, 국내 제도의 공백을 서울시와의 실무적 협력 구조 구축을 통해 돌파하는 실행 가설을 제시합니다. 이를 바탕으로 송현을 단순한 일회성 마케팅 공간이 아니라, 장소·서비스·민관협력·운영조건을 실제로 검증하는 에리어매니지먼트 실증사업으로 설정합니다.
검증 범위	이러한 전략적 방향을 구체화하기 위해 송현 실증사업에서 실제로 검증 가능한 범위(민관 협업 프로토콜, 운영 원가, 품질 등)와 검증 불가능한 광역적 한계 요인을 명확히 식별합니다. 또한 단기 이벤트 전략을 차단하기 위한 6대 금기 의사결정 원칙을 수립하고, 공간솔루션센터, 기업마케팅센터, 기획추진센터 등 통합 TF 조직별 명확한 R&R 및 핵심 산출물 표준을 정립합니다.
공공 얼라인	에리어 매니지먼트를 실제로 성공시키기 위해 서울시 및 공공 파트너가 중점적으로 검증하는 8대 공공성 가치(공원 조성 취지, 시민 이용권, 형평성, 회계 투명성 등)를 분석했습니다. 나아가 플레이스메이킹-에리어매니지먼트-BID의 계층적 연계 구조를 수립하고, 현장 가동 전 하우스가 반드시 답해야 할 10대 핵심 질문과 대응 가이드를 제안합니다.
실행계획	실증 실행 계획(Part 2)에서는 총 7단계의 유기적 업무 마일스톤 흐름을 확립하고, 1단계 기반 데이터 취합과 2단계 현장 리서치를 통한 문제 정의 및 기회 포착 과정을 정량화합니다. 공간솔루션의 이용자 여정(Journey Map) 데이터와 기획추진의 자산 운영 제약(시설, 안전, 보안 등) 관찰 결과를 교차 분석하여 핵심 기회영역 초안을 도출하는 R&R 분배안을 제시합니다.
MVP 성과평가	마지막으로 본 보고서는 우선 실증 가설 카드를 구체화하고, 지속 가능한 현장 운영을 위해 서울시 협업 관리와 최소 실행 패키지(MVP)의 초기 예산(CapEx/OpEx) 조율안을 수립합니다. 실행 타당성 검증 게이트웨이와 주체별 최종 체크리스트 승인을 거쳐 현장을 가동하며, 가동 후 6대 핵심 평가지표(장소경험, 주체참여, 운영성, 경제성, 공공성, 노하우)를 통해 성과를 계량적으로 분석하고 향후 IOTA SEOUL과 SBD 등 후속 프로젝트에서 참고할 수 있는 적용조건을 정리합니다.

DISCLAIMER

본 자료는 이지스자산운용의 송현 BID 프로젝트 방향 및 실증 실행계획에 관한 내부 의사결정 보좌용 전략 검토서이며, 특정 금융상품에 대한 투자 권유나 확정적인 성과를 보장하는 자료가 아닙니다. 자료에 포함된 실행계획, 조직 R&R, 예산안, 서울시 협의 일정은 현재의 가정과 가설을 바탕으로 하며, 향후 서울시 실무 협의, 파트너십 조건, 내부 이사회 의결 및 실제 실증 가동 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
최종 의사결정은 확정된 공식 계약서와 행정 승인 및 TF 최종 합의를 기준으로 이루어져야 합니다.

Part 0. Background

시장·고객·크레딧 패러다임의 구조적 변화

Chapter 0-1. 산업과 크레딧의 구조적 변화

AI 인프라 대두 등 거시적인 시장 패러다임의 변혁과 '수요-계약-운영-전환' 가능성을 검증하는 New Credit 심사 평가 체계의 등장을 상세 분석합니다.

Chapter 0-2. IGIS의 New Credit 체계 전환과 송현 BID

기존 단일 부동산 투자 한계를 극복하기 위해, 권역 단위 통합 관리를 도입하는 이지스의 전략적 방향성 전환과 송현 실증사업의 유기적 연계성을 규명합니다.

Part 1. Strategy

송현 BID 정의와 실행 방향성

Chapter 1-1. 프로젝트 방향설정과 포지셔닝

송현동 이지스 보유 부지와 인근 서울시 공공공간을 연결하는 통합운영 가설을 수립하고, 향후 대형 복합개발의 리스크 제어용 PoC로서의 역할을 정립합니다.

Chapter 1-2. 송현 실증사업의 검증 범위 판단

민관 역할 분담, 서비스 품질/원가, 주변 상권 연계 등 실제 현장 테스트가 가능한 영역과 현 단계에서 검증이 불가능한 한계 요인을 명확히 구분합니다.

Chapter 1-3. 거버넌스 주체별 역할

공간솔루션센터(콘텐츠 기획), 기업마케팅센터(네트워크 연계), 기획추진센터(전략 및 리스크 통제)의 전속 R&R과 부서 간 상호 업무 협업 표준을 수립합니다.

Chapter 1-4. 핵심 전략 및 가이드라인

공공 파트너(서울시)가 심사 시 중점적으로 검증하는 가치를 분석하고, 실제 가동 전 선제 대응해야 할 구체적인 장소·운영·재무적 핵심 질문에 대응합니다.

Part 2. Action Plan

마일스톤 및 평가 지표

Milestone 1. 송현에 뭐가 있나 - Back Data 취합/분석

송현동 실물 자산과 인접 권역의 내부·공개 데이터를 전수 조사하고, 국내외 선진 플레이스메이킹 성공/실패 사례를 비교 분석하여 사실 기반의 기준선을 수집합니다.

Milestone 2. 어떤 불편/만족을 겪나 - 리서치 기반 문제 정의 및 기회 포착

실제 현장 방문객의 시간대별 트래픽 정량 분석과 이용 경험 설문(Journey Map)을 통해 서비스 가능한 공간을 파악하고 우선 기회 영역을 도출합니다.

Milestone 3. 현 조건에서 무엇을 시도할 수 있나 - 서비스 가설 설계 및 운영체계 구축

보행 활성화, 복합 리테일 연계 등 3대 서비스 가설 카드를 설계하고, 안전·보안·미화 및 시설 O&M의 지속성 보장 방안과 서울시 정기 조율 계획을 가동합니다.

Milestone 4. 무엇부터 작게 실행할 것인가 - MVP 도출 & 최종 실행 준비

가설을 최소 범위로 검증할 최소 실행 패키지의 구체적인 예산(CapEx/OpEx)과 안전사고 대비 통합 요건, 주체별 최종 이행 점검 체크리스트를 마련합니다.

Milestone 5. 어떻게 작동했으며 무엇을 남길것인가 - 실증 운영 성과 평가 & 노하우의 SBD 전이

수집된 정량 트래픽과 만족도 수치를 다차원 지표로 교차 평가하여 지속/보완/종결 여부를 판정하고, 확보된 위탁계약 표준을 데이터 플랫폼에 보존합니다.

PART 0. Background


시장·고객·크레딧 패러다임의 구조적 변화

Chapter 0-1

산업과 크레딧의 구조적 변화

글로벌 공간 수요의 근본적 재편 동인


AI 혁명과 지정학적 재편은 공간 수요를 재구성함

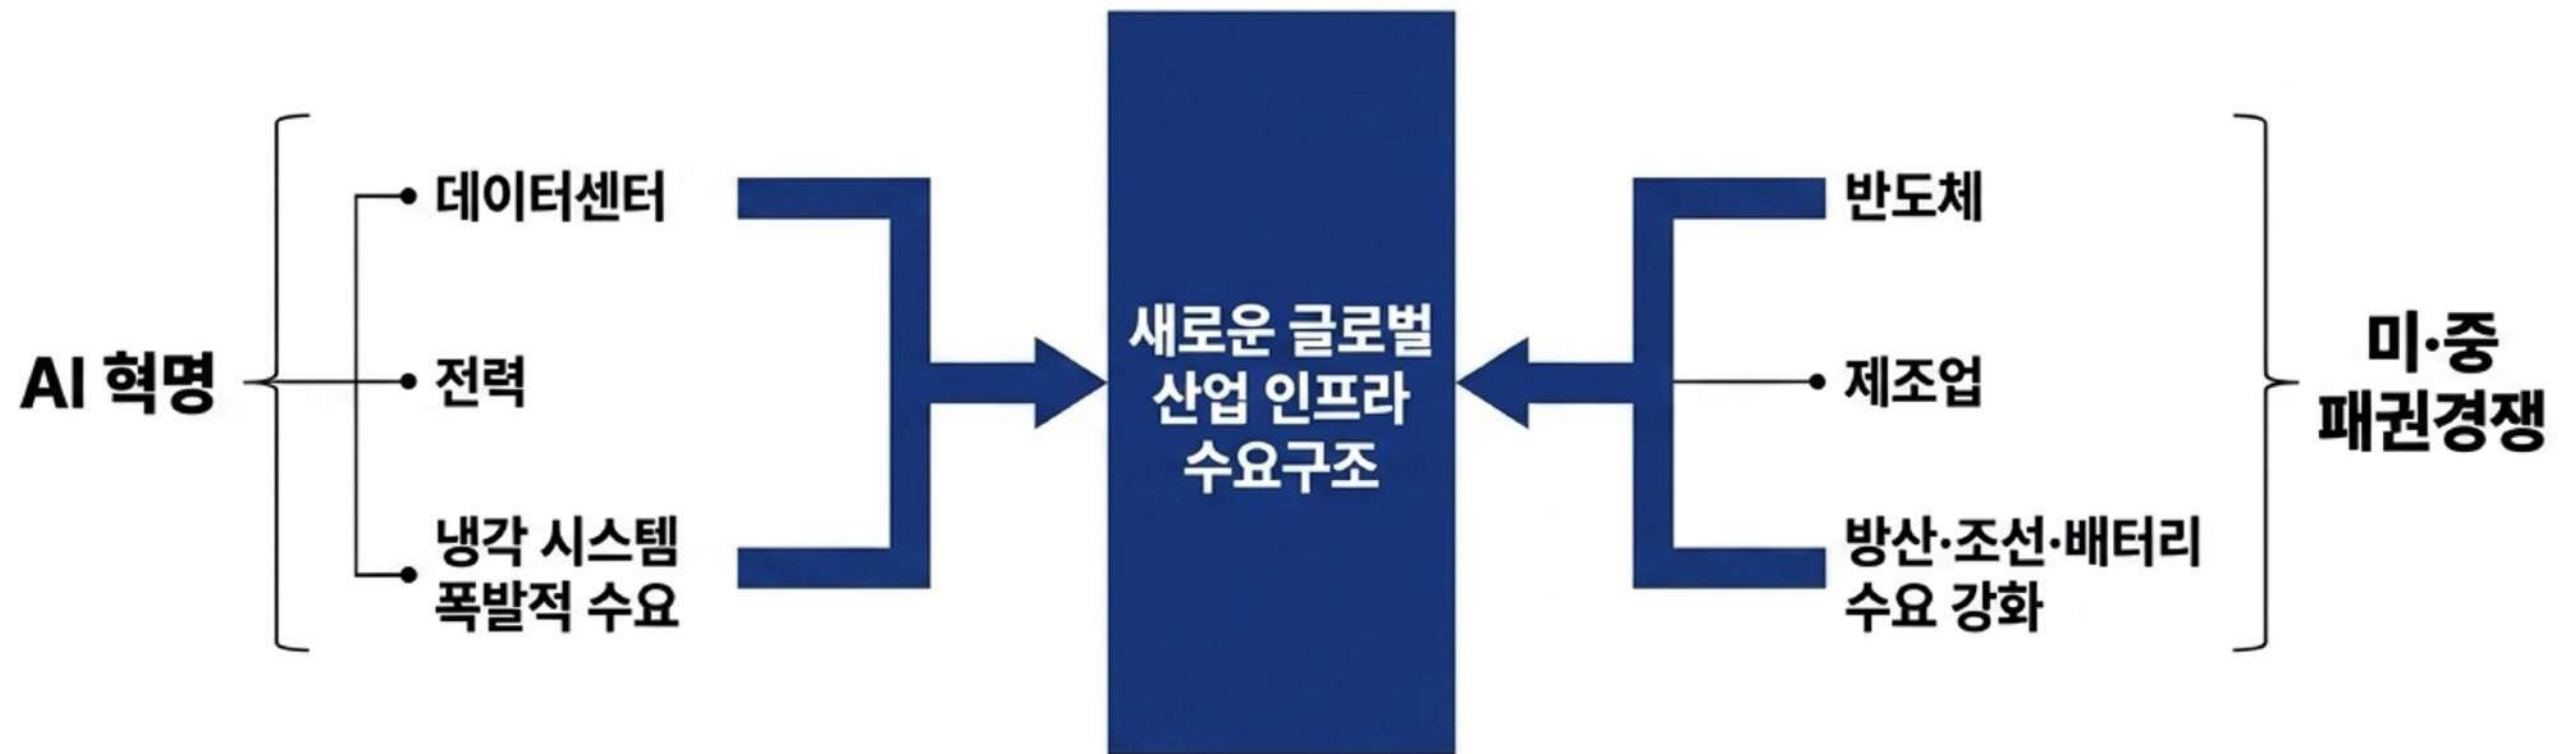

인공지능과 공급망 재편은 단순 부동산 개발을 넘어 **전력과 핵심 산업 인프라의 융합을 강제함**

전통적 부동산 자산 평가 분류의 한계

자산 등급을 New Credit 체계로 전환하여 심사함

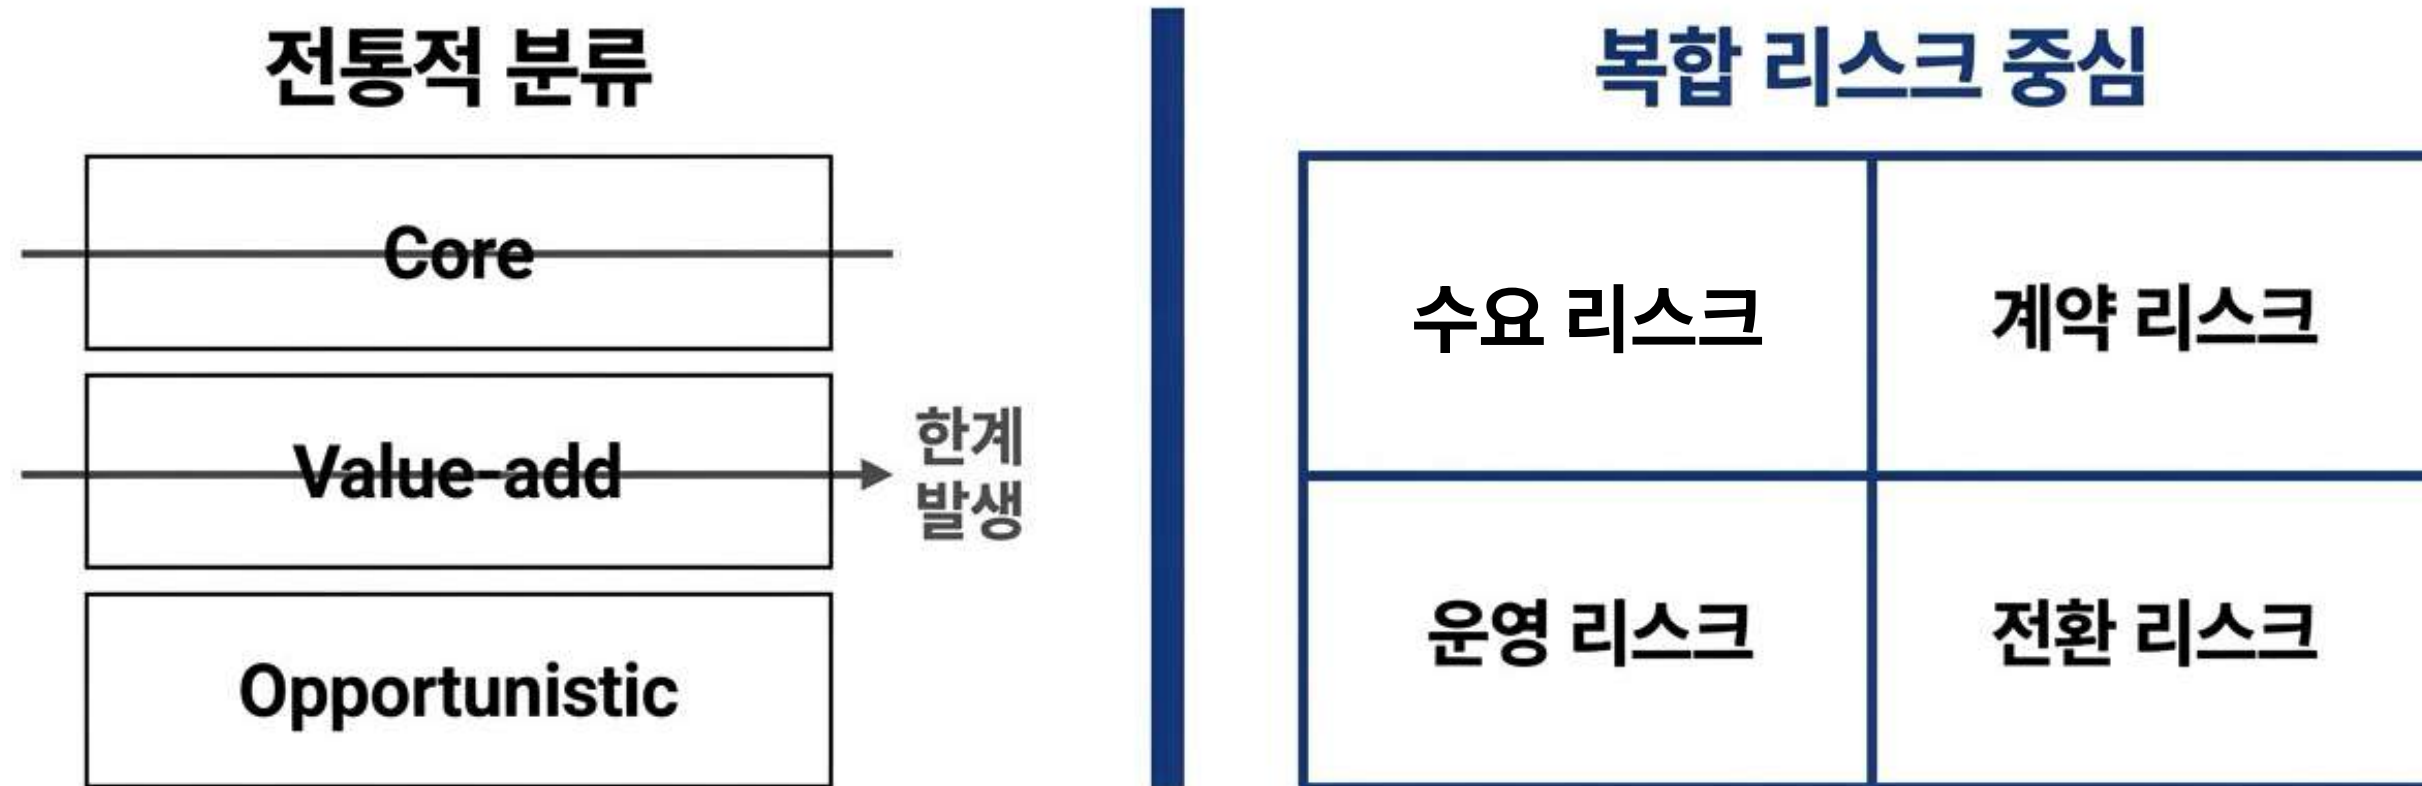

전통적 오피스 등급 위주 심사에서 탈피하여 수요·계약·운영·전환 가능성 중심의 다각적 신용 평가 모델을 적용함

글로벌 공간 수요의 근본적 재편 동인

자산 등급에서 4단계 검증 기반 새로운 크레딧으로

수요 (Demand)	Offtake / 선임차 / 전력 수요	필수 검증 요건
계약 (Contract)	Lease / PPA / BTS / 책임임차	
운영 (Operation)	OpCo / O&M / 시공 / 보험	
전환 (Transition)	Exit Buyer / REIT 편입 / 재융자	


자산의 내재등급이 아닌, 누가 쓰고 어떻게 계약, 운영, 회수되는지를 검증하는 4계층 구조로 심사 기준이 완전 이동함

Chapter 0-2

IGIS의 New Credit 체계 전환과 송현 BID

고객과의 약속부터 다수 상품 성과와 보상까지 연결


일물일펀드가 아닌 다수 상품 기반 통합 서비스 체계(플랫폼) 필요

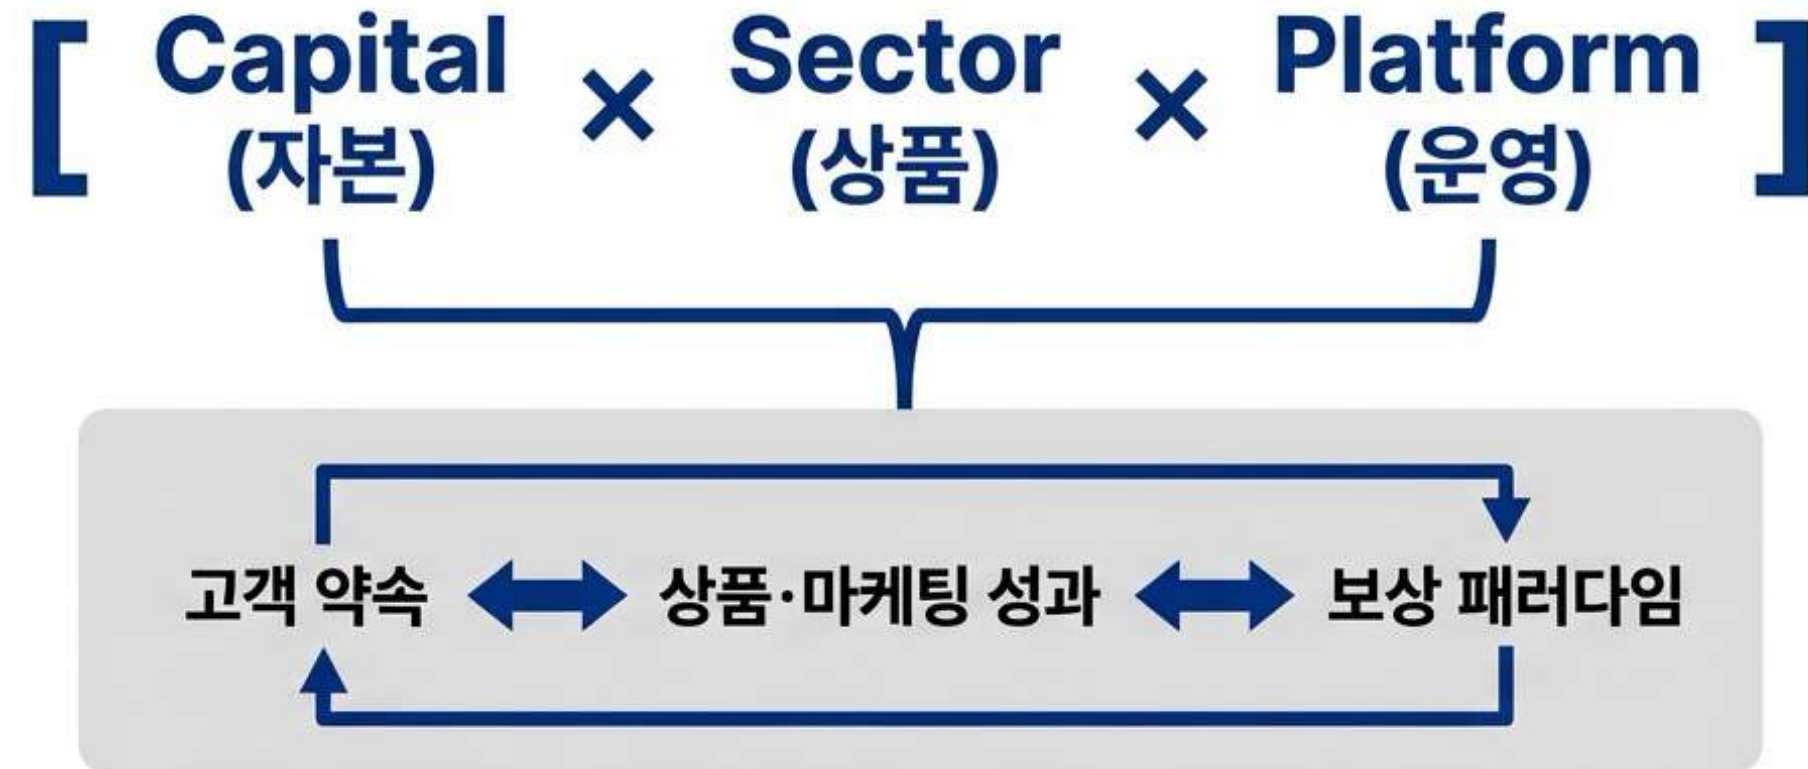

고객 약속부터 최종 성과 보상까지 단일 파이프라인으로 연결된 통합 상품(인프라 x 자산 x 서비스 x 운영) 통한 경쟁력 확보


공간 매니지먼트의 필요성

단일 자산의 한계를 극복하기 위한 공간 관리 체계 수립 필요



단일 자산 중심

기존 단일 프라퍼티(Property) 매력도 향상 전략은
글로벌 및 국내 자본 유치에 역부족임

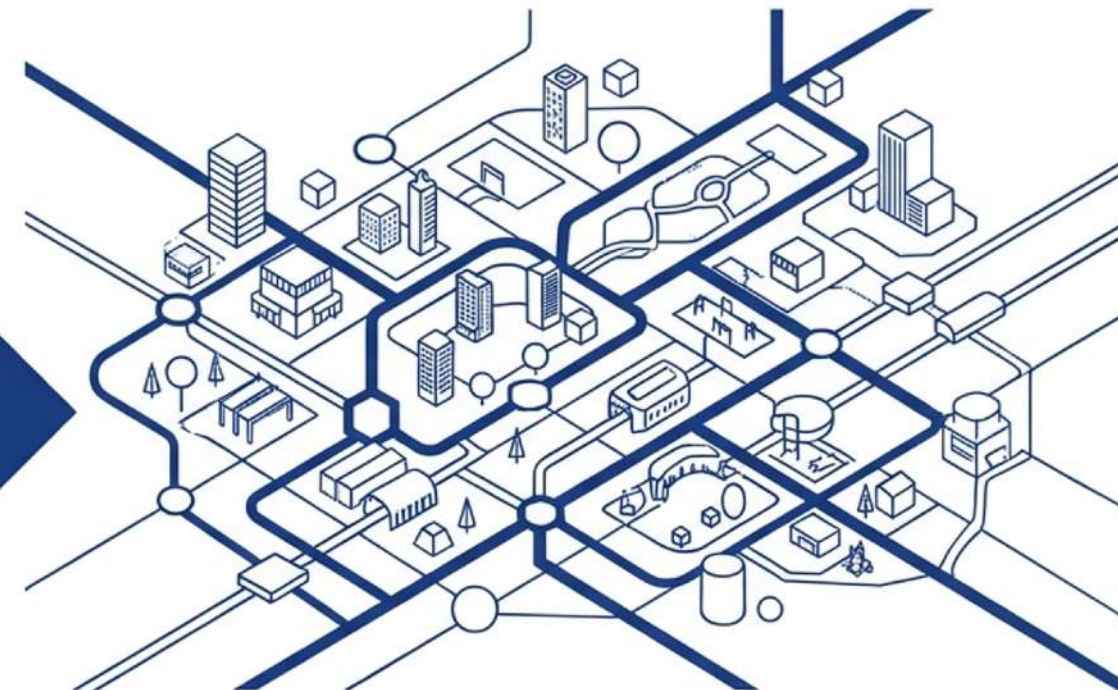


구역 단위 에리어 매니지먼트

부동산 기반 공간 인프라 전체를 묶어내는 플레이스메이킹과
BID(Business Improvement District) 운영 역량이 필수적임

기존의 개별 부동산 매입 및 단순 개선 관성에서 탈피하여, 공간 인프라 전체를 묶어서 운영하는 구역 단위 에리어 매니지먼트로 방향성을 확장 전환해야 함


송현 BID는 New Credit의 4대 축과 연결되는 중요한 실행과제

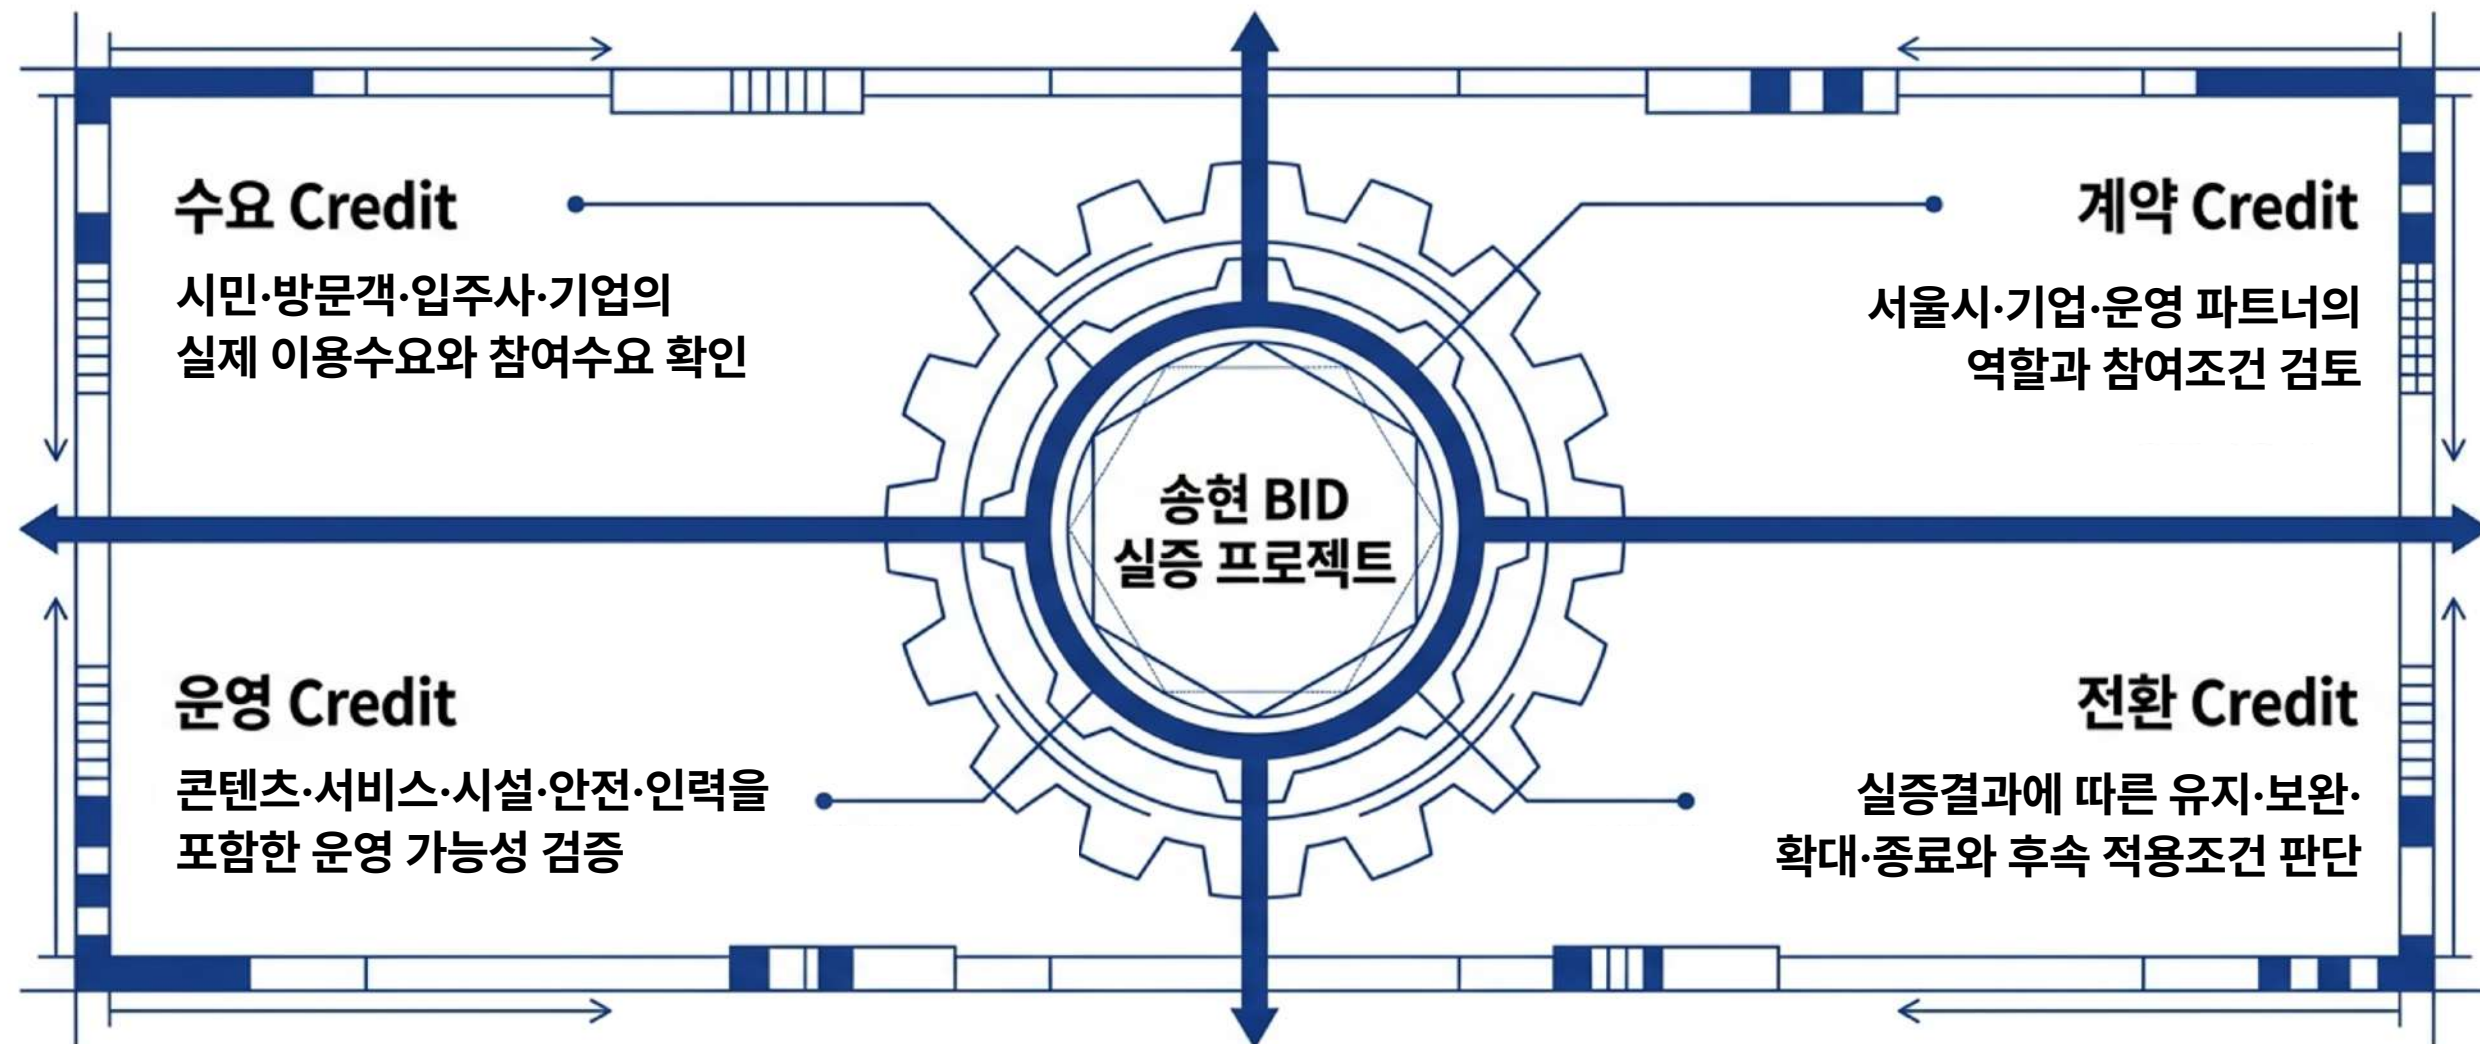

회사의 방향성에 부합하며 수요·계약·운영·전환의 네 축과 연결되는 현장 실행과제로 기능

공공 협력과 이지스 복합 수행력 범위 확장


송현 실증을 통해 민관협력과 장소운영 노하우를 축적

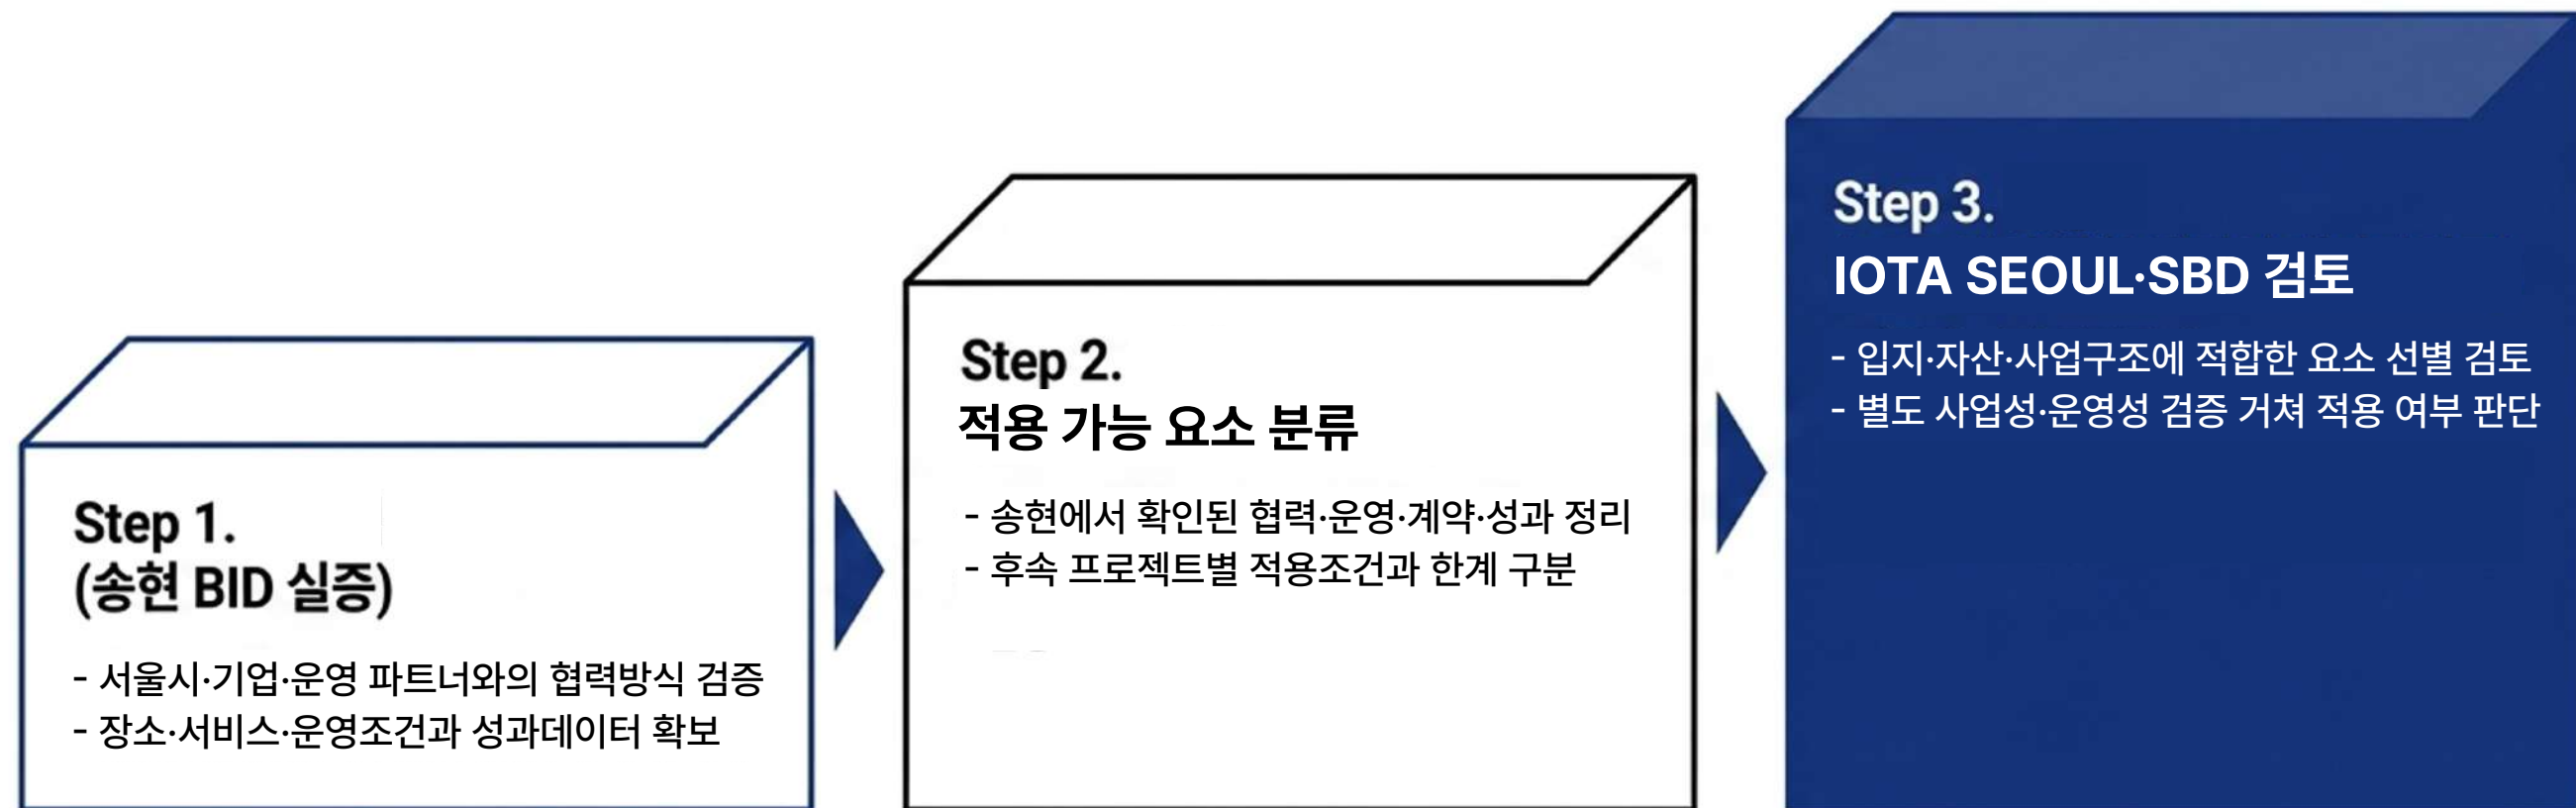

송현의 성과를 후속 사업에 자동 전이하지 않고, 사업조건이 부합하는 요소를 근거로 활용

5자 협력 거버넌스 구축

서울시·기업·상권·시민이 상생하는 통합 민관 거버넌스 구축

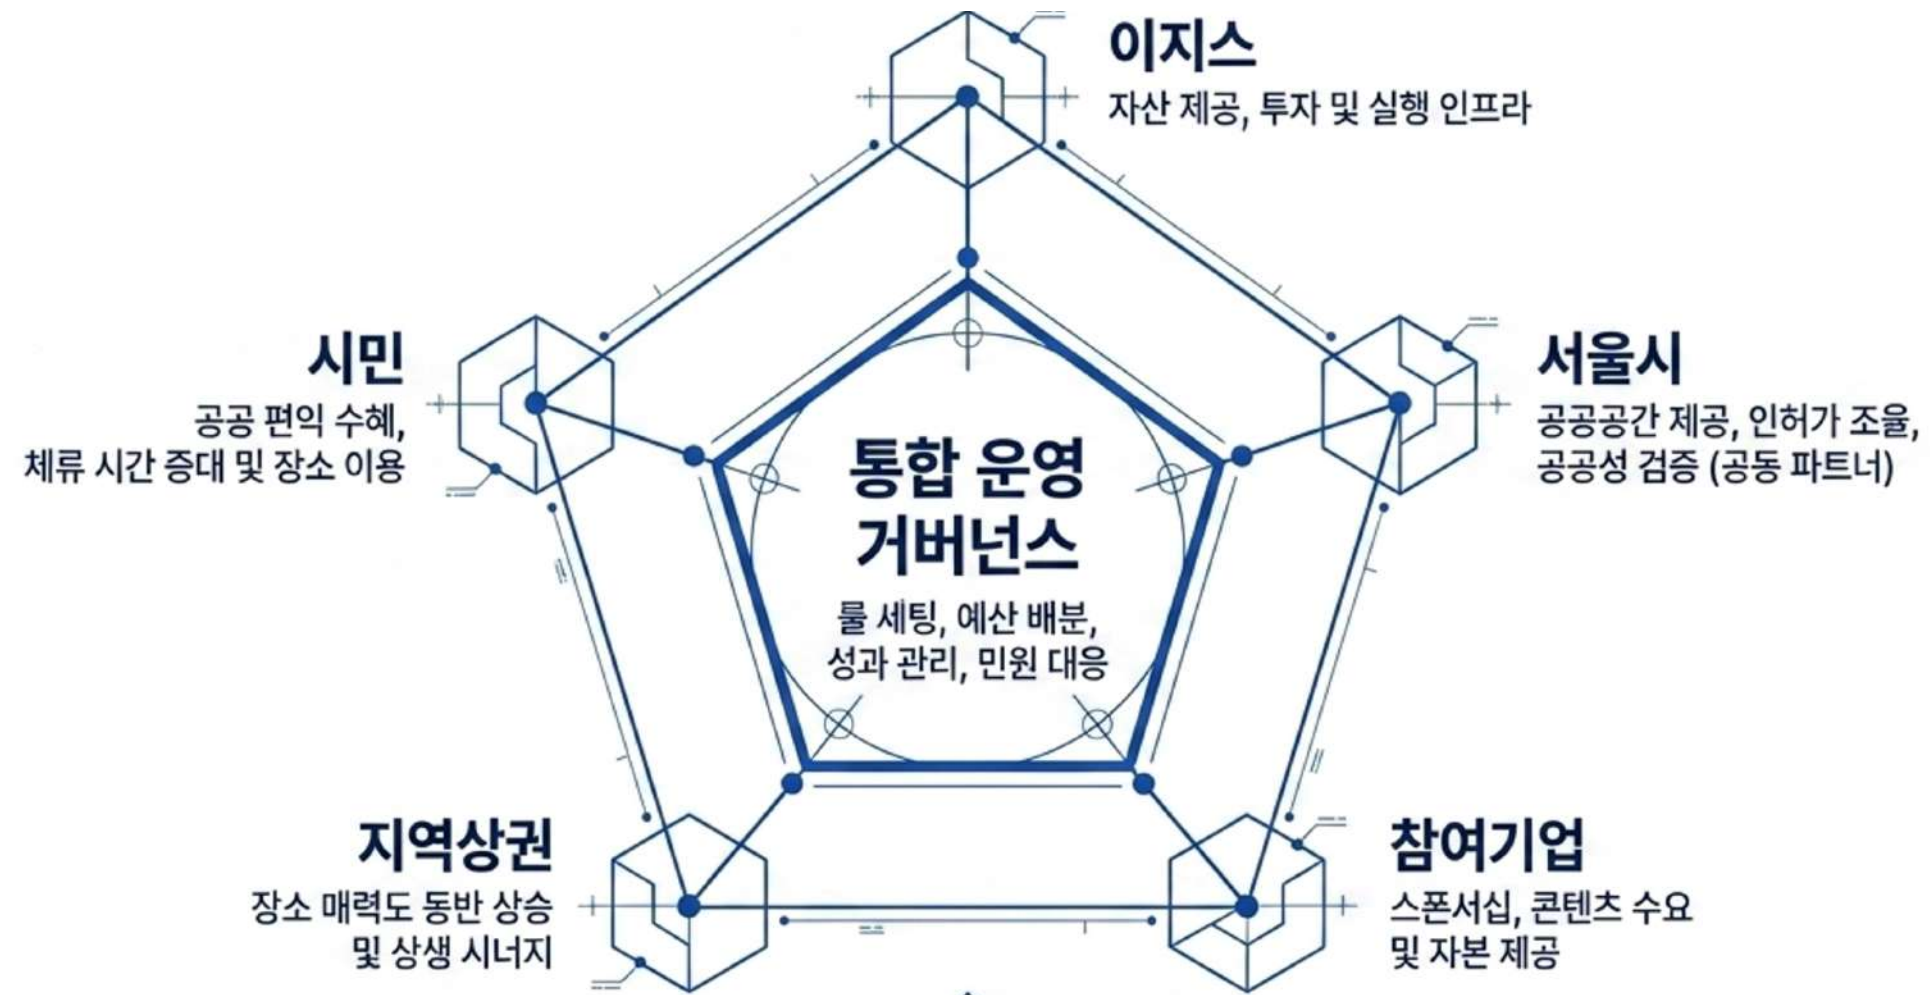

플레이스메이킹 콘텐츠와 서비스를 거버넌스로 연결, 주체별 자원과 실행력이 지속 가능하게 맞물리는 민관협력 기본형 모델을 수립

PART 1. Strategy


송현 BID 정의와 실행 방향성

Chapter 1-1

프로젝트 방향설정과 포지셔닝

송현동 코어 자산과 인접 공공 광장의 연계 에리어 매니지먼트 영역


이지스 자산과 공공 공간을 연계하여 통합 운영 환경을 수립한다

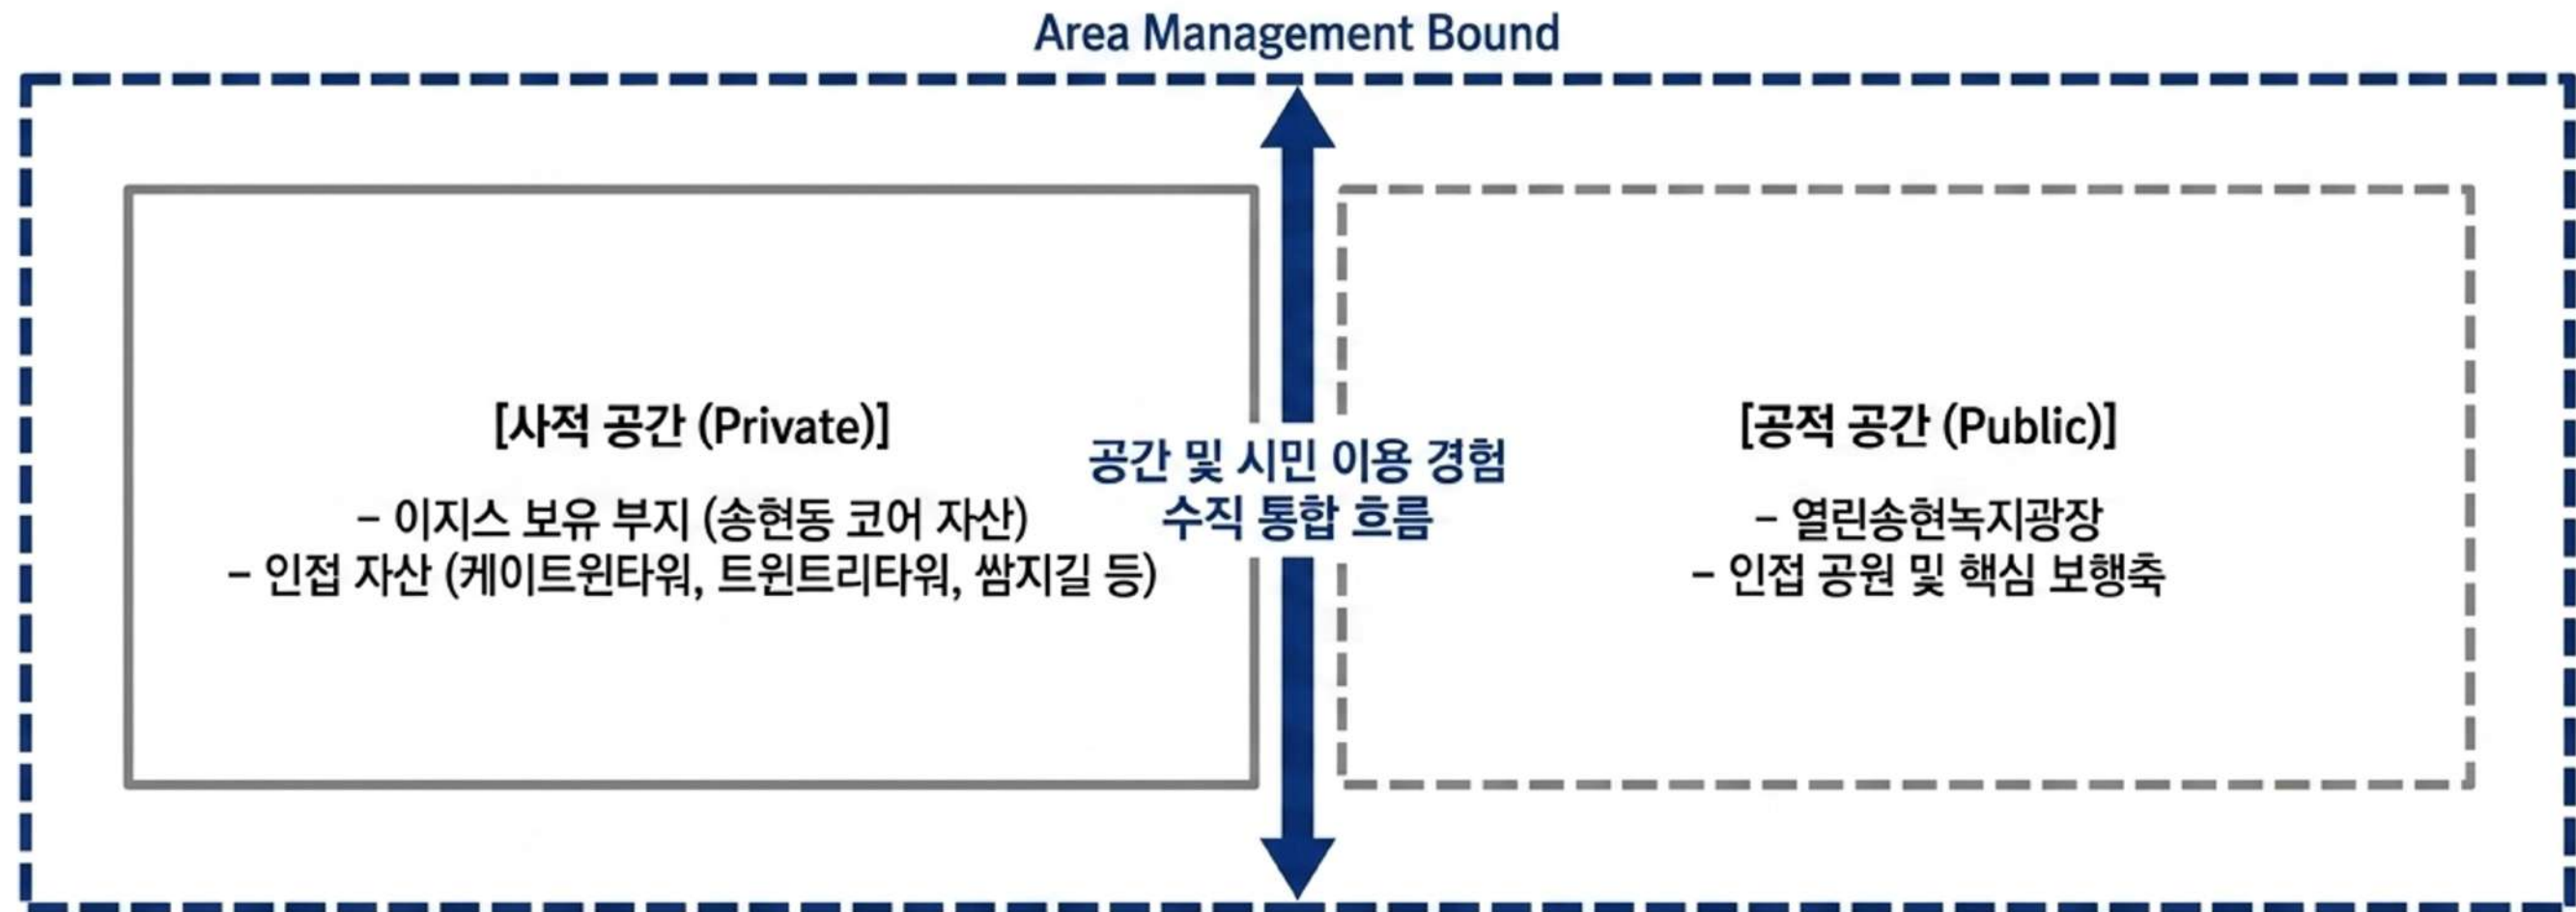

개별 부동산의 사적 경계를 넘어 공간과 시민 이용 경험의 수직 통합을 유도, 자산가치를 공공공간의 활성화와 유기적으로 밀착시킴

사실 기반 경험 개선 가설 설계

이용 경험과 자산 실태를 근거로 현장 실증 가설을 수립한다

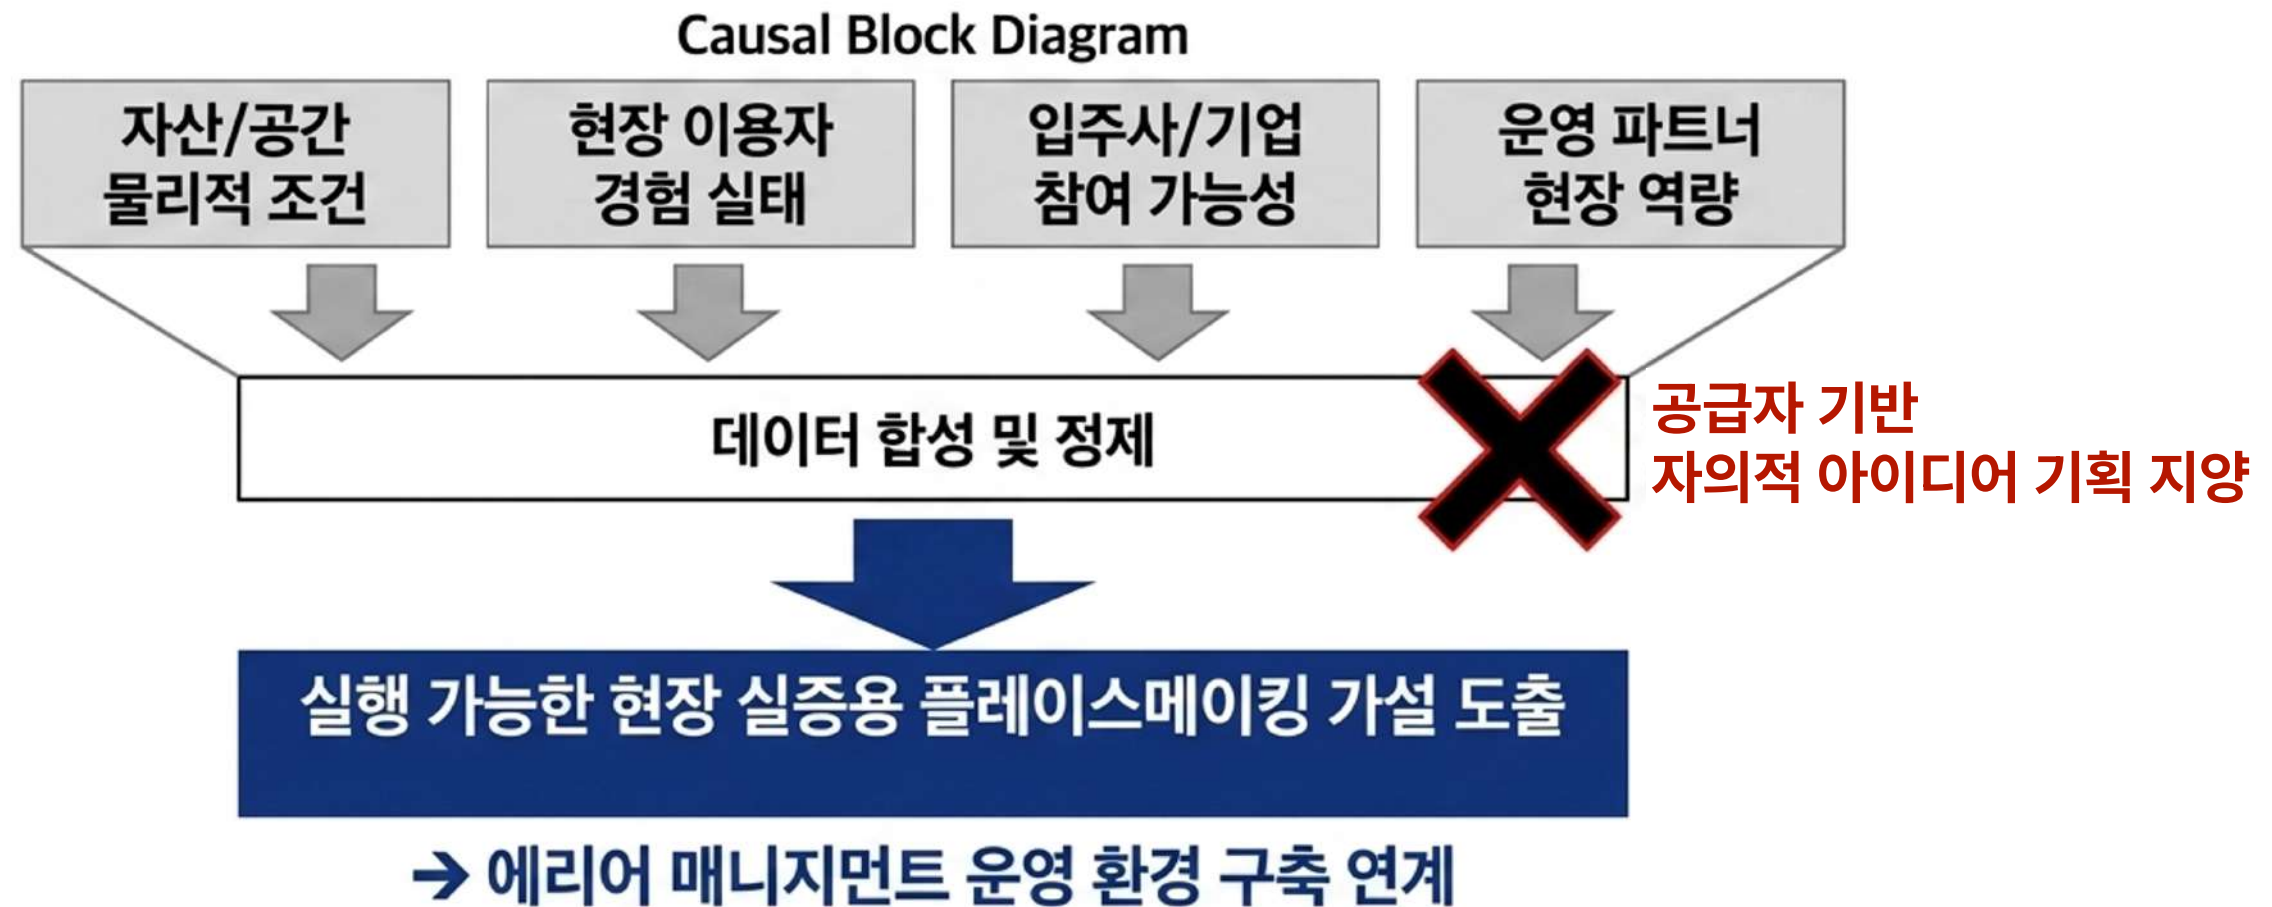


기획자의 막연한 직관에 의존하는 기획을 배제하고, 현장 정량 데이터와 이해관계자 요구조건에 기반한 실증 가설을 수립

국내 법정 부담금 제도 부재에 대응한 행정 협력 채널 선제 가동

제도 공백 극복을 위하여 서울시 실무 협력 체계를 우선 확립한다

현 단계에서는 법적 제도 개선을 기다리기보다,
서울시의 정책 방향성과 얼라인(Align)된 실무 협력 관계 형성이 최우선임

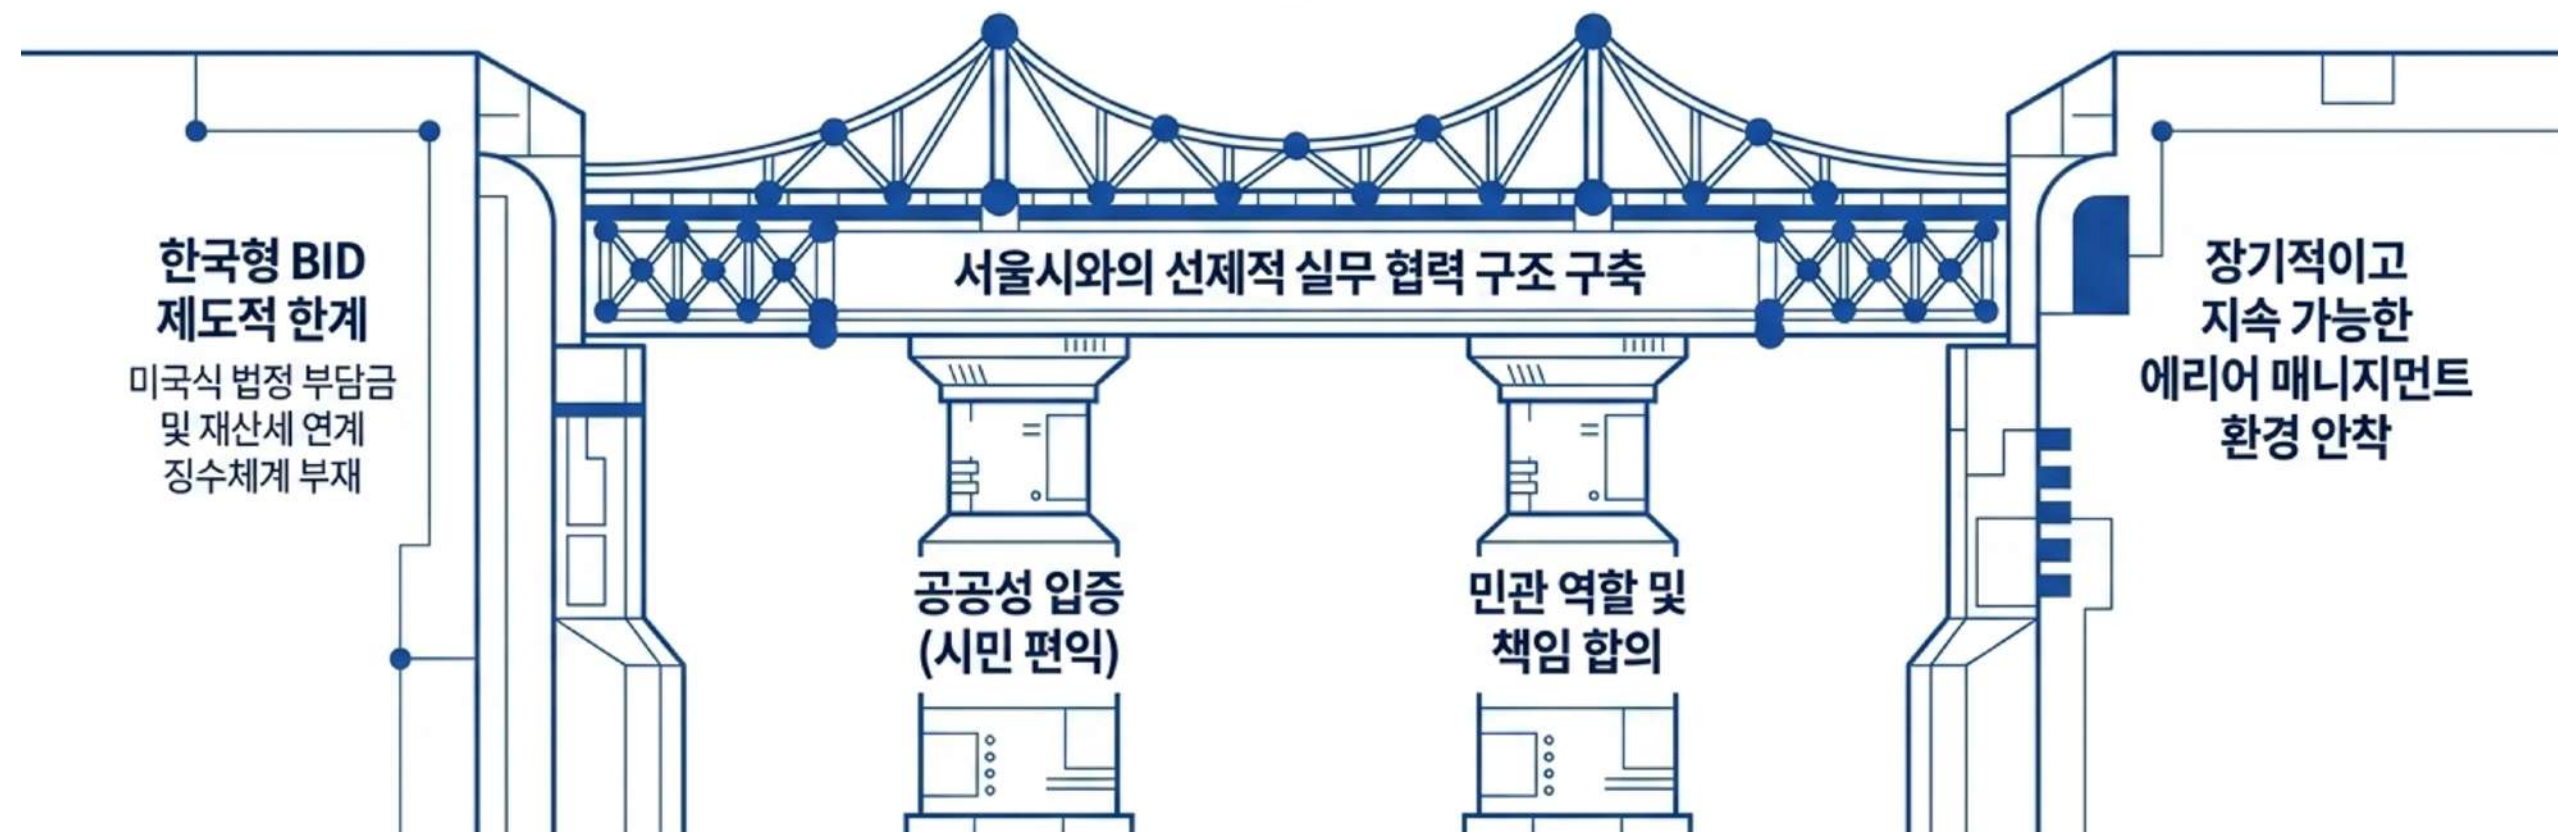

제도 공백을 사업 보류의 핑계로 삼지 않고, 서울시와의 선제적인 파트너십 구축을 통해 실무 해결 경험과 상호 신뢰를 확보

Chapter 1-2

송현 실증사업의 검증 범위 판단

서울역-남산 광역 SBD 사업과 송현동 실증 사업 분리

송현과 SBD는 별도 사업으로 구분하여 검증

무리한 단일 사업성 연계 배경 및 개별 실증 구조로 구분함	송현동 실증 구역	서울역-남산 광역 SBD
	입지	광역 연결
	자산 형태	다수 소유자 복합 자산
	플레이어	다수 이해관계자
	보행 인프라	서울로/남산 연계 보행망

송현과 SBD는 입지, 자산 형태, 협력 주체가 상이하므로 송현의 단기적 성과를 남산 광역권의 사업성 지표로 연동 해석하는 오류는 방지

민관 협력 에리어 매니지먼트 구조 구축을 위한 초기 검증 요소

거버넌스 정착을 위한 실무 검증요소 설정

 역할/책임 분담 민관의 실무적 권한 한계 규명	 공공공간 관리/프로그램 공원 및 광장 운영 범위 설정	 행정 vs 추가 서비스 기존 공공서비스와 민간 서비스 경계 분리	 점용/안전 인허가 행사 및 시설 관련 인허가 협의 절차
 자체재원 구조 운영비 충당 및 수익 배분 체계 검증	 수용성 시민, 상인, 방문객의 변화 체감 여부	 성과/회계/민원 체계 정기보고, 회계 투명성 및 민원 처리	 전담조직 역량 실무 운영 전담 조직의 한계 테스트

일회성 행사에 머무르지 않고 민관 거버넌스가 직면하고 해결해야할 행정적/재무적 과도기 요소를 검증할 것

서울시 초기 신뢰 관계 형성을 위한 공공 가치 기반 전략 수립

공공성과 운영 효율이 융합된 밸류 프로포지션 수립



서울시와의 대관 소통 시 단기 매출 목표를 배제하고, 공공성과 운영 신용을 검증하는 순수 실증 PoC로 본 사업의 성격을 규정함

운영 가설 검증 용 실증 범위

수직 통합 공간 관리를 위한 필수 가설을 세우고 검증

[운영/서비스 (Front-end)]

① 민관 협업 프로토콜

② 품질 및 원가

③ 프로그램 이용성

④ 주변 상권 연계

[관리/백오피스 (Back-end)]

⑤ 안전/민원 대응

⑥ 운영사/O&M


⑦ 성과보고 체계

⑧ 표준 관리계약/
SLA 기본형

현장 가동 시 확실하게 증명할 수 있는 실무 영역을 선제 정의하여 프로젝트의 구체성을 확보

송현은 SBD 사업 축소판이 아니다

송현만으로 검증하기 어려운 것은 분리하여 추후 별도 검증

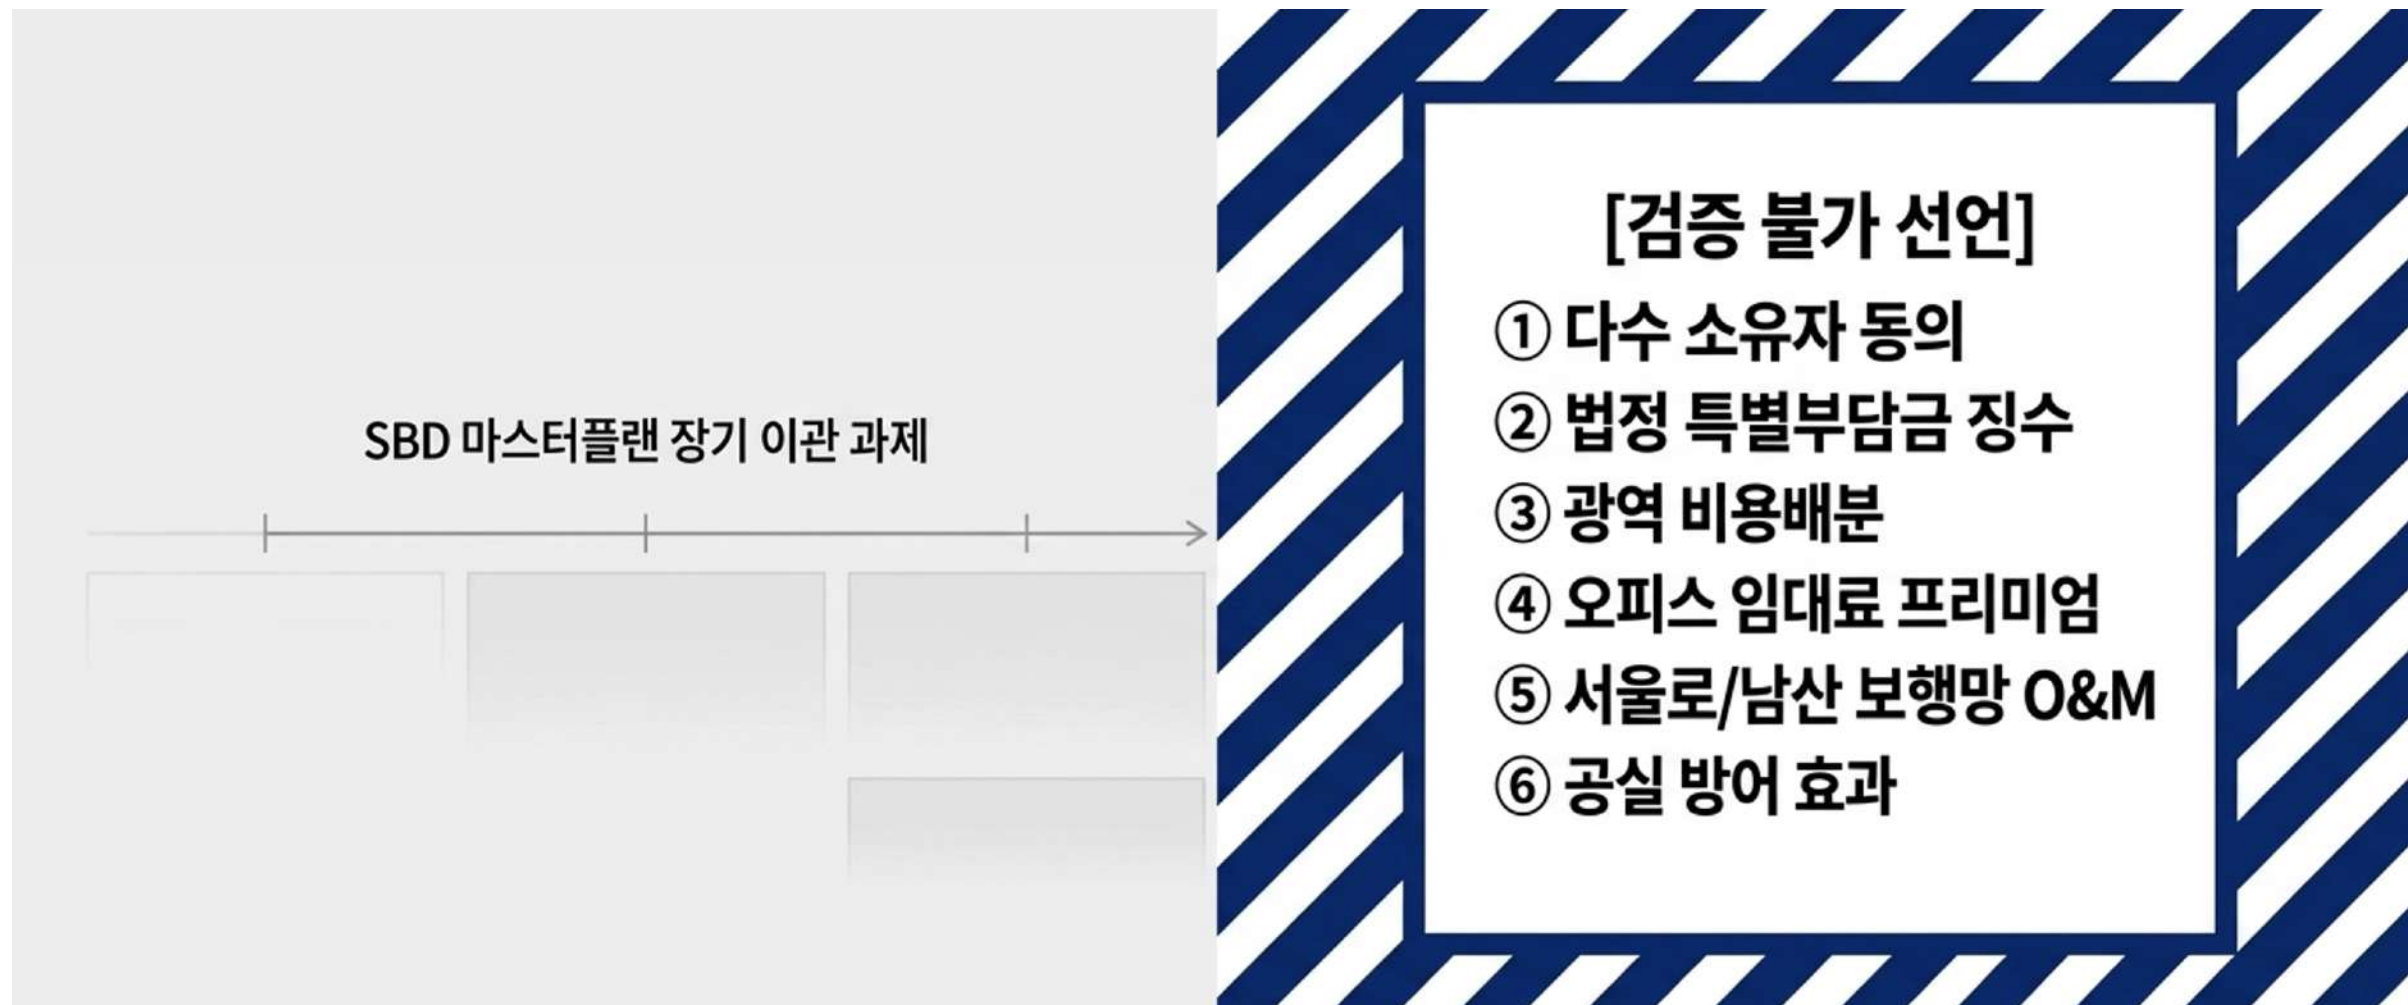

송현 단독 실증으로는 검증이 불가능한 요인을 명확히 구분, 무모한 상위 사업 검증요소 확대를 억제

최종 회수해야 할 성과


송현 BID 실증사업을 통한 핵심 목표 성과

[관계/책임]	[데이터/리스크]	[시스템/자산]
실무 협력 관계	기업 실 참여 수요	KPI 입증 데이터
역할/책임 합의	실물 운영원가	의사결정 원장
최소 서비스 단위	리스크 프로토콜	표준계약/SLA 원형

실증 전후 이슈 기록을 정량화된 시스템 자산으로 구축하여 후속 마스터플랜의 근거로 활용

본 프로젝트에서 지양해야 할 사항들

단기 이벤트로 전략을 방지하기 위해 지양해야 할 사항들

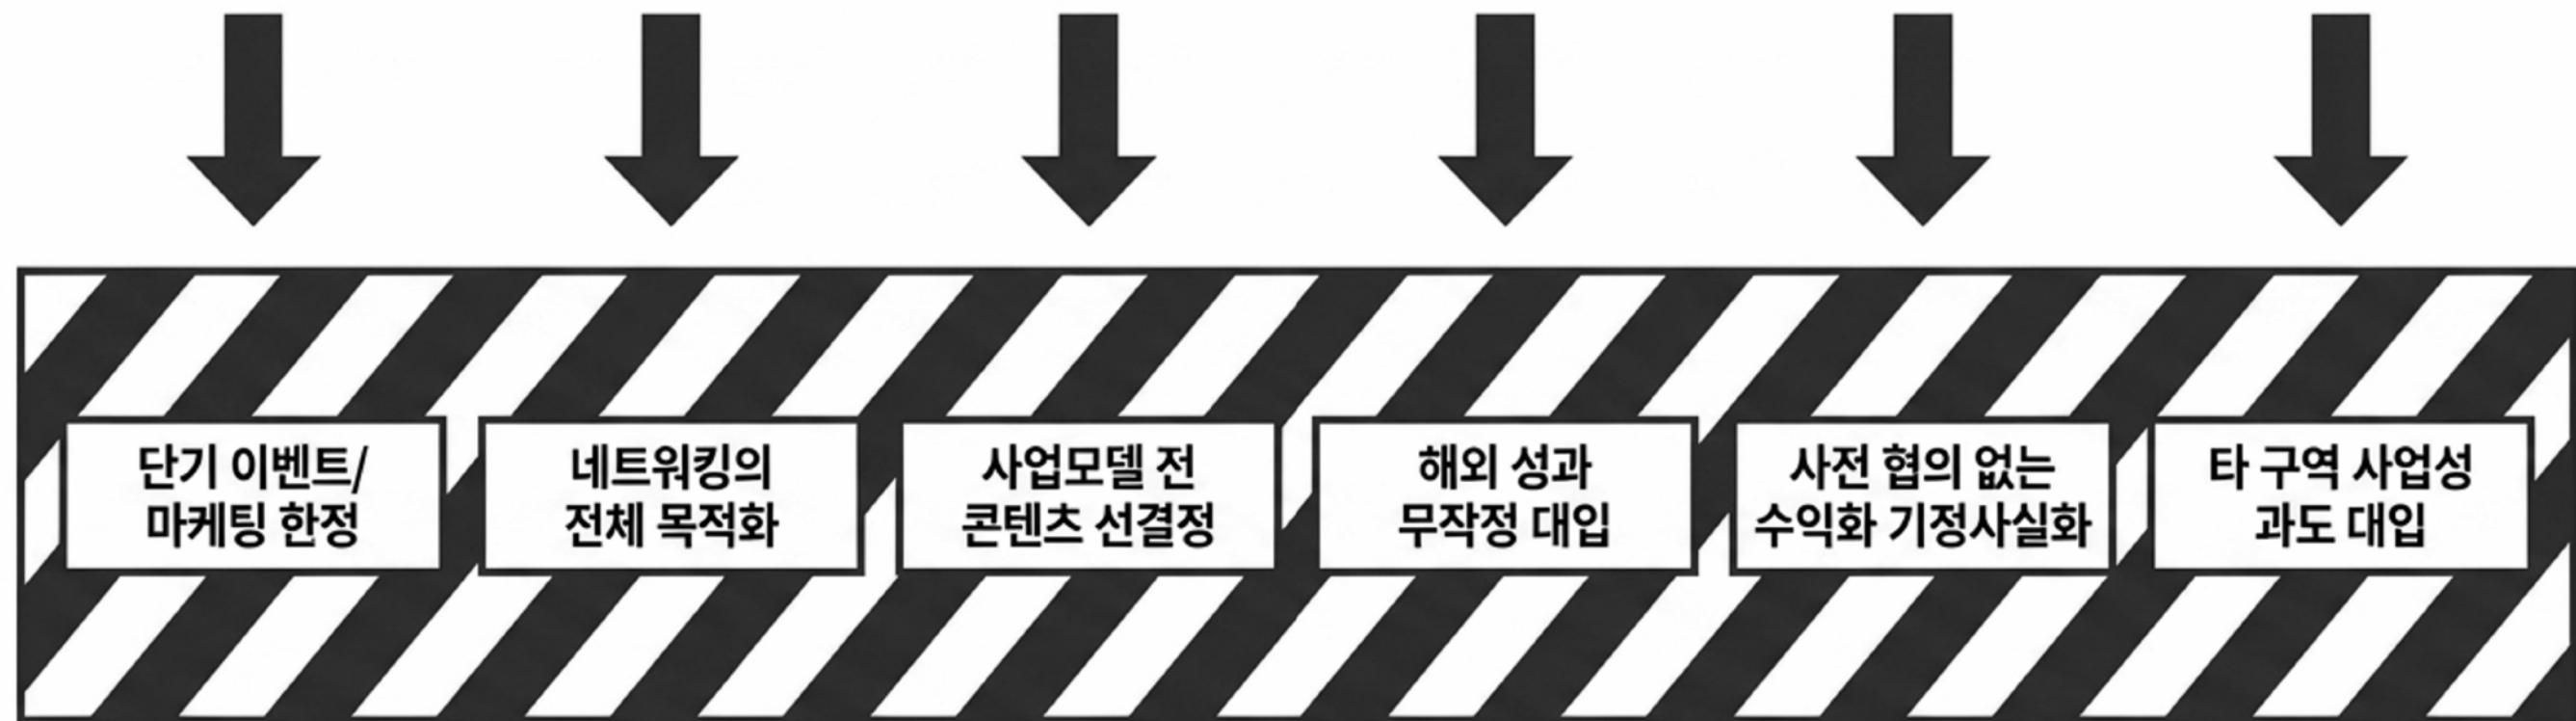

지양점을 상기하고 장소·서비스·민관협력·운영조건을 검증하는 송현 실증사업의 정체성을 유지함

Chapter 1-3

거버넌스 주체별 역할

서비스/운영 모델 설계

송현 현장 콘텐츠 및 운영 모델 설계 단계별 TASK

**실행주관에 따른 R&R : 정(正) 공술 / 부(副) 기획추진




장소 가치를 극대화할 수 있는 콘텐츠와 공간 O&M 및 스폰서십 구조의, 현장 실행 후 개선안 도출까지 모델 실행/운영 전담

서비스/운영 모델 산출물

서비스/운영 모델 핵심 산출물 및 성과 기준

**실행주관에 따른 R&R : 정(正) 공술 / 부(副) 기획추진

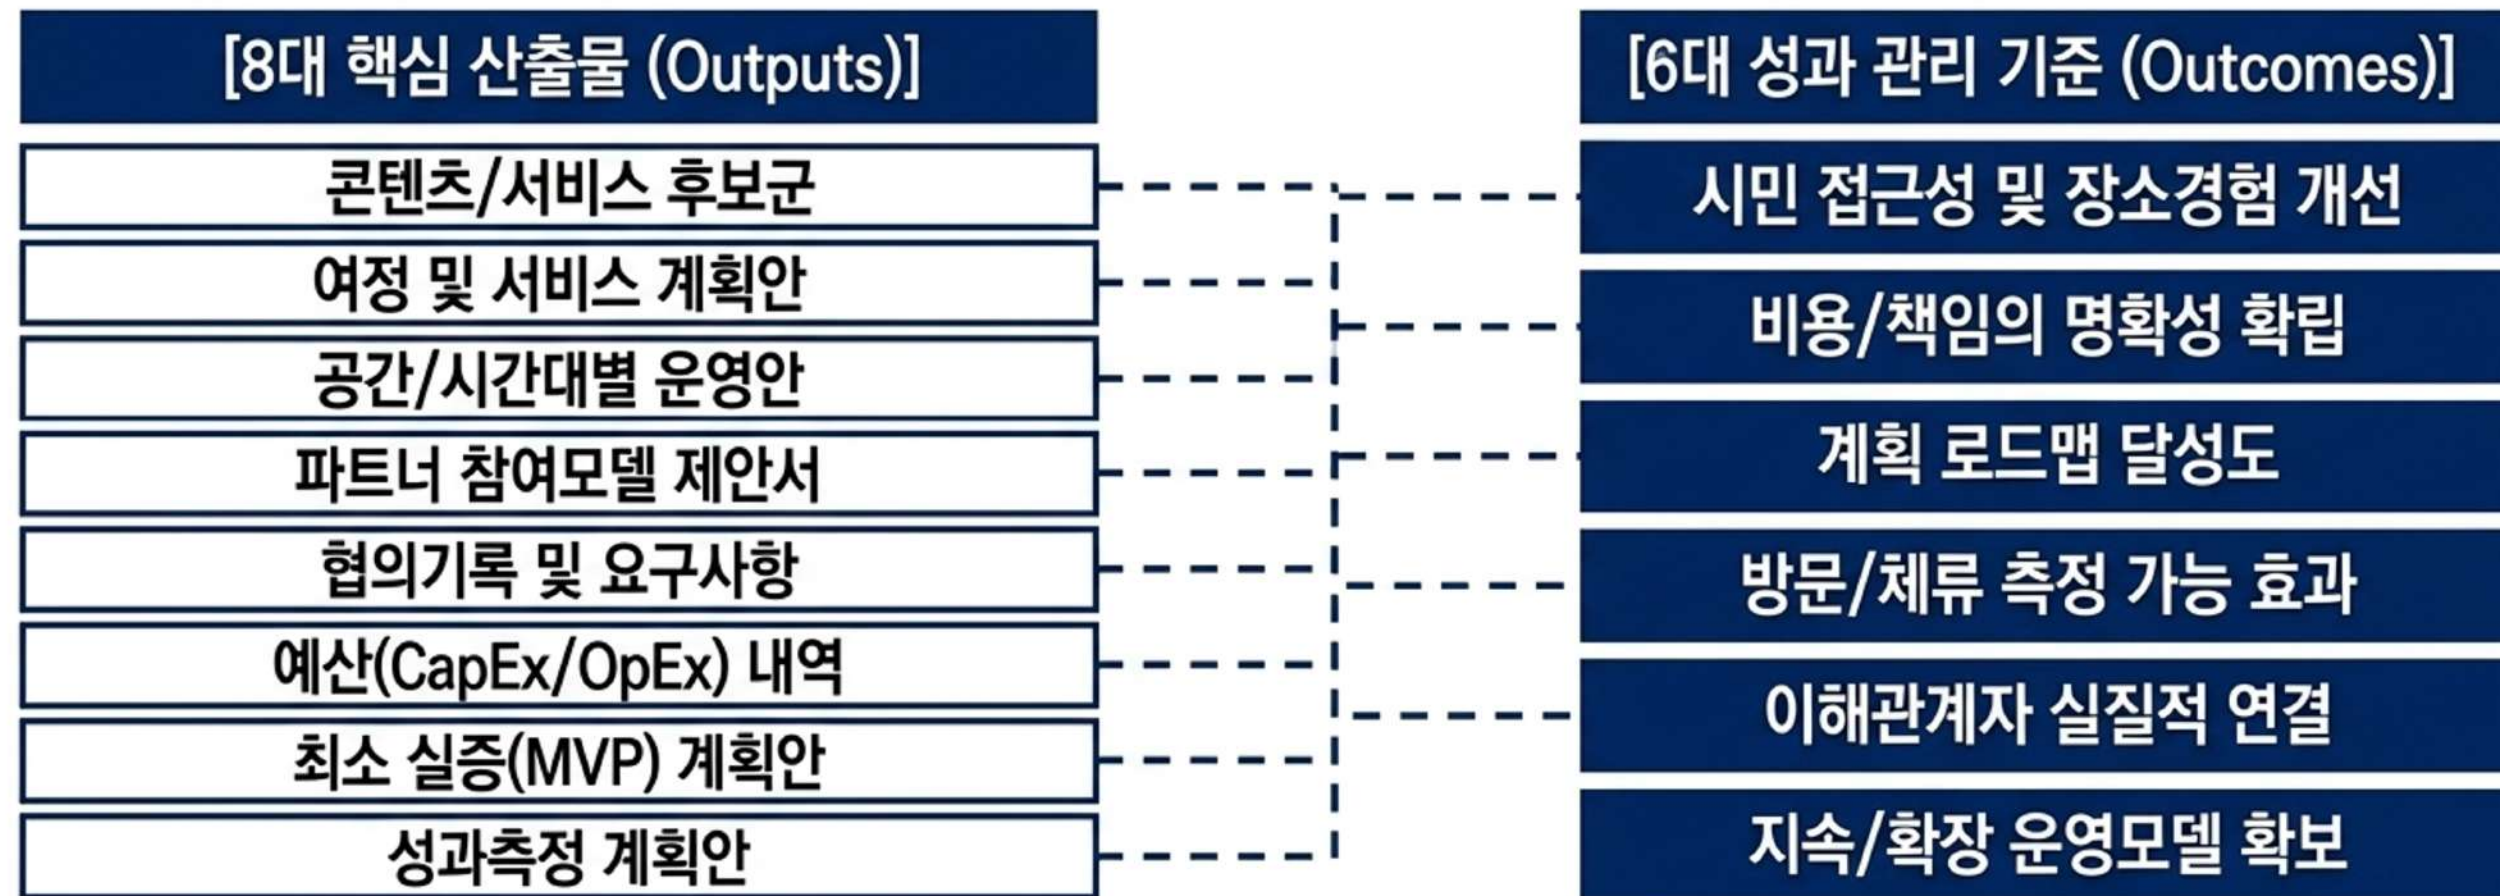


단순 아이디어 목록 지양, 장소 개선 효과와 비용 책임 한계선을 정량 지표를 통해 명확히 정형화

기업 네트워크 지원

이지스 보유 기업 네트워크(및 잠재고객 풀)지원 TASK

**실행주관에 따른 R&R : 정(正) 기업마케팅센터 / 부(副) 기획추진, 공솔

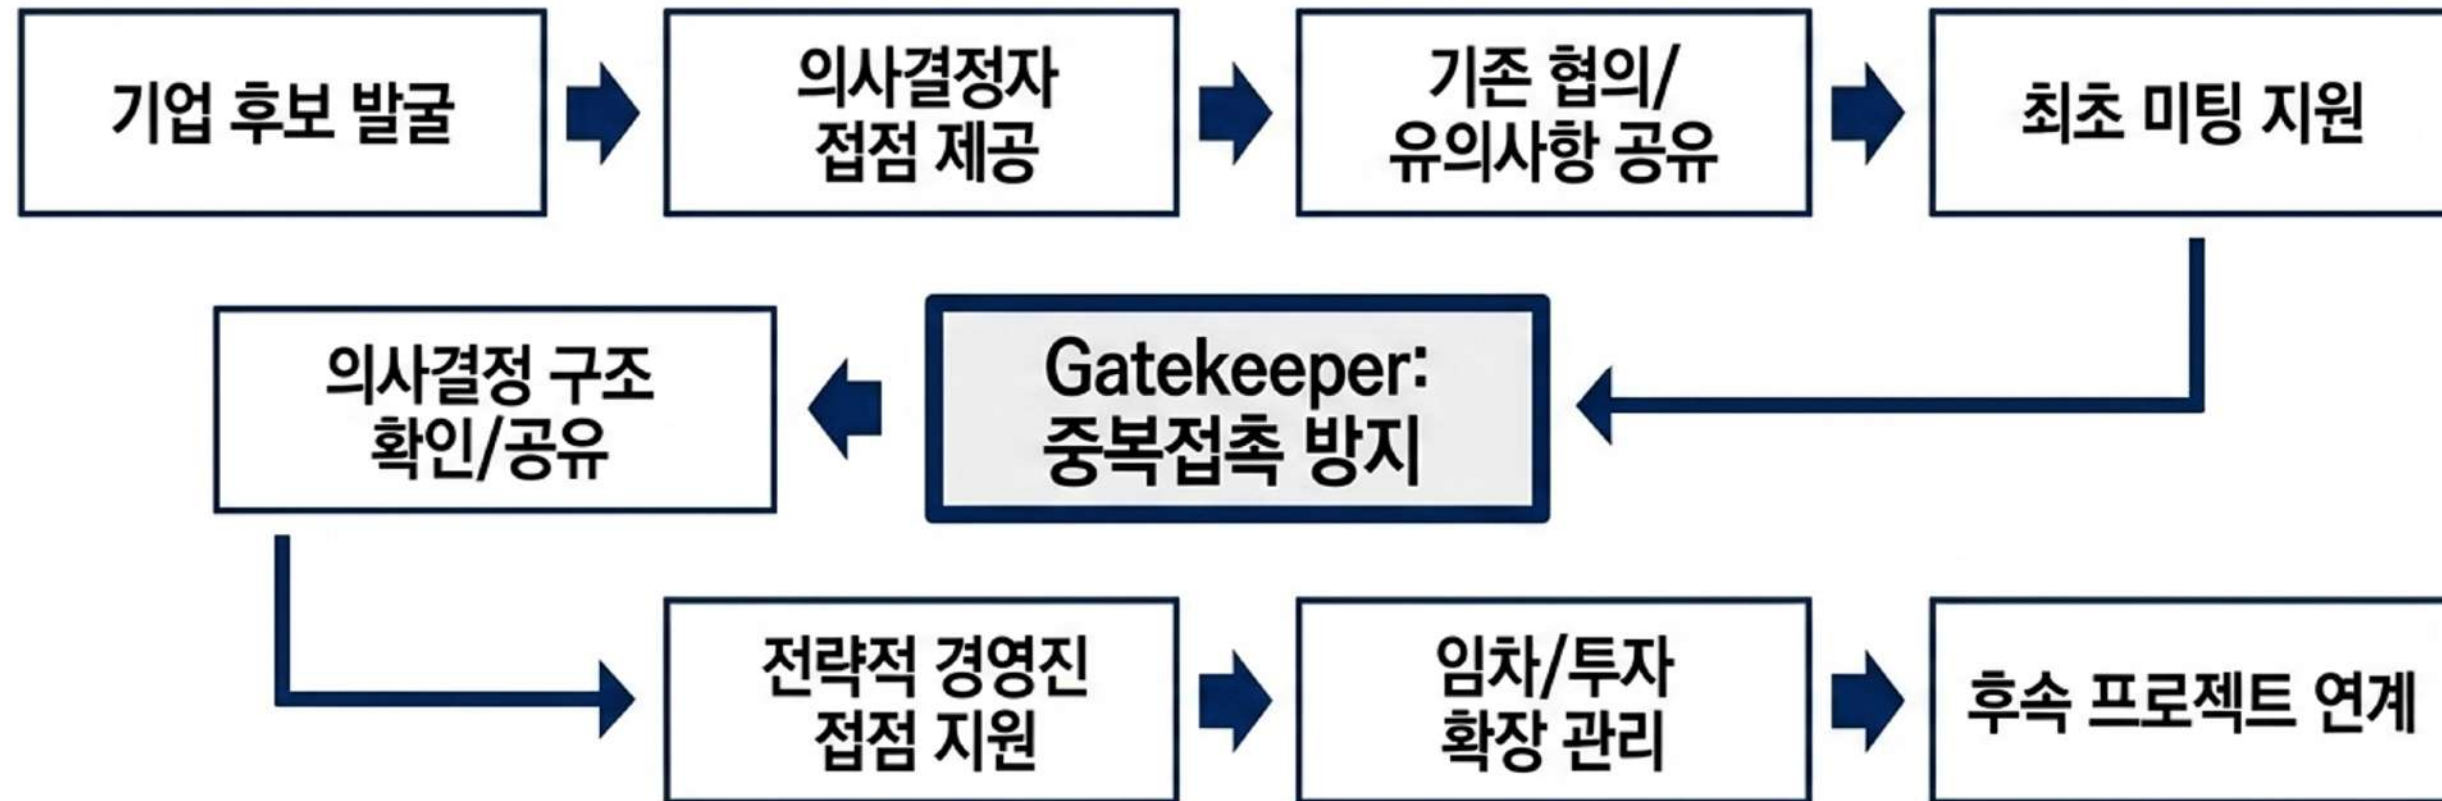

이지스의 전사적 기업 네트워크를 송현의 실질적 참여 수요와 결합하고 중복 접촉 충돌 통제

기업 네트워크 산출물

기업 지원 네트워크 활동 산출물 및 성과 기준

**실행주관에 따른 R&R : 정(正) 기업마케팅센터 / 부(副) 기획추진, 공솔




단순 기업 담당자 소개를 넘어 **관계 충돌 방지 및 실증 이후의 임차/투자 파이프라인**으로 성과를 확장

거버넌스 총괄 및 민관 협력 행정 절차 통합 관리

BID 프로젝트 통합관리 TASK

**실행주관에 따른 R&R : 정(正) 기획추진 / 부(副) 공솔

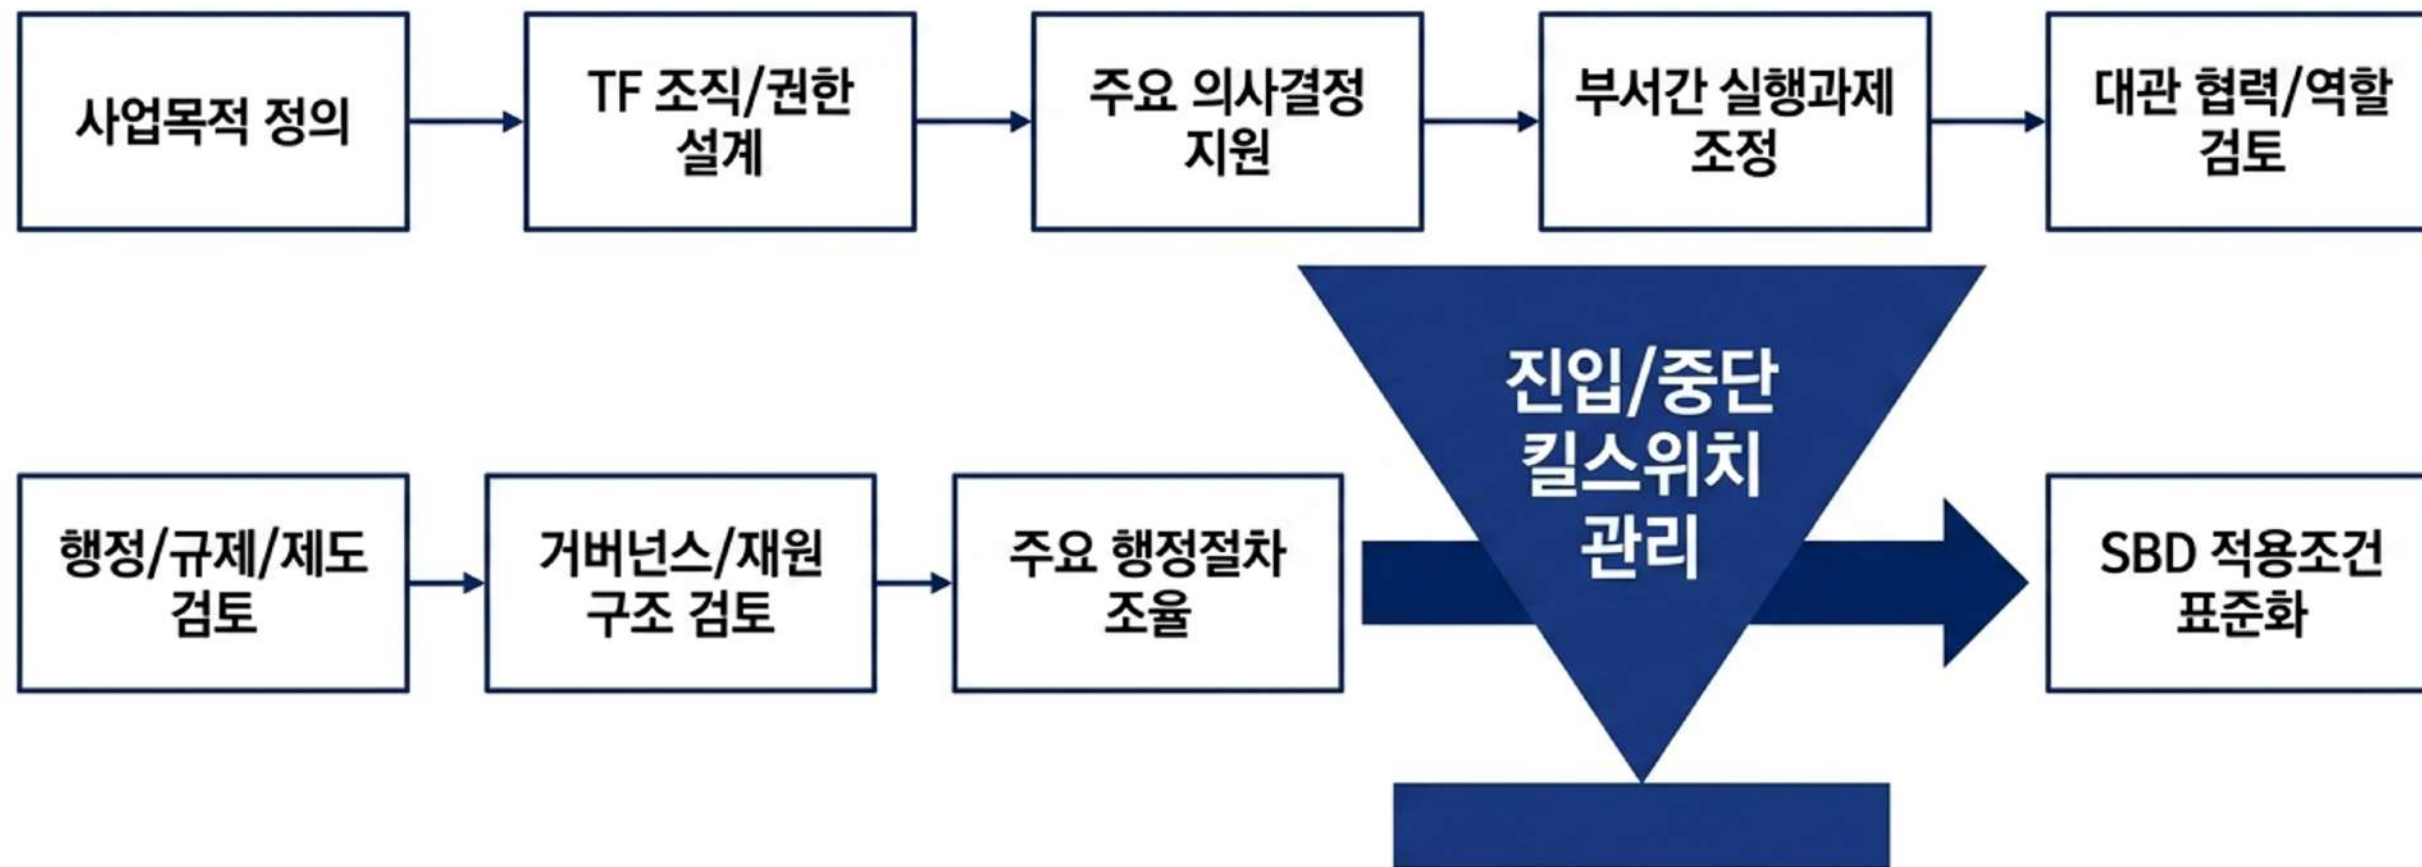

상위 전략 축과 통제 규칙을 고정하고 협력간 이해관계와 법무, 허가, 회계 리스크 조정

통합관리 산출물


프로젝트 통합관리 산출물 및 성과 기준



실증 결과의 표준화 및 계량화, SBD 사업으로의 전이 타당성 확보

서울시 민관 협력 BID 협의 시 중점 가치

BID 검토 시 서울시 관점에서 중시하는 가치 확인

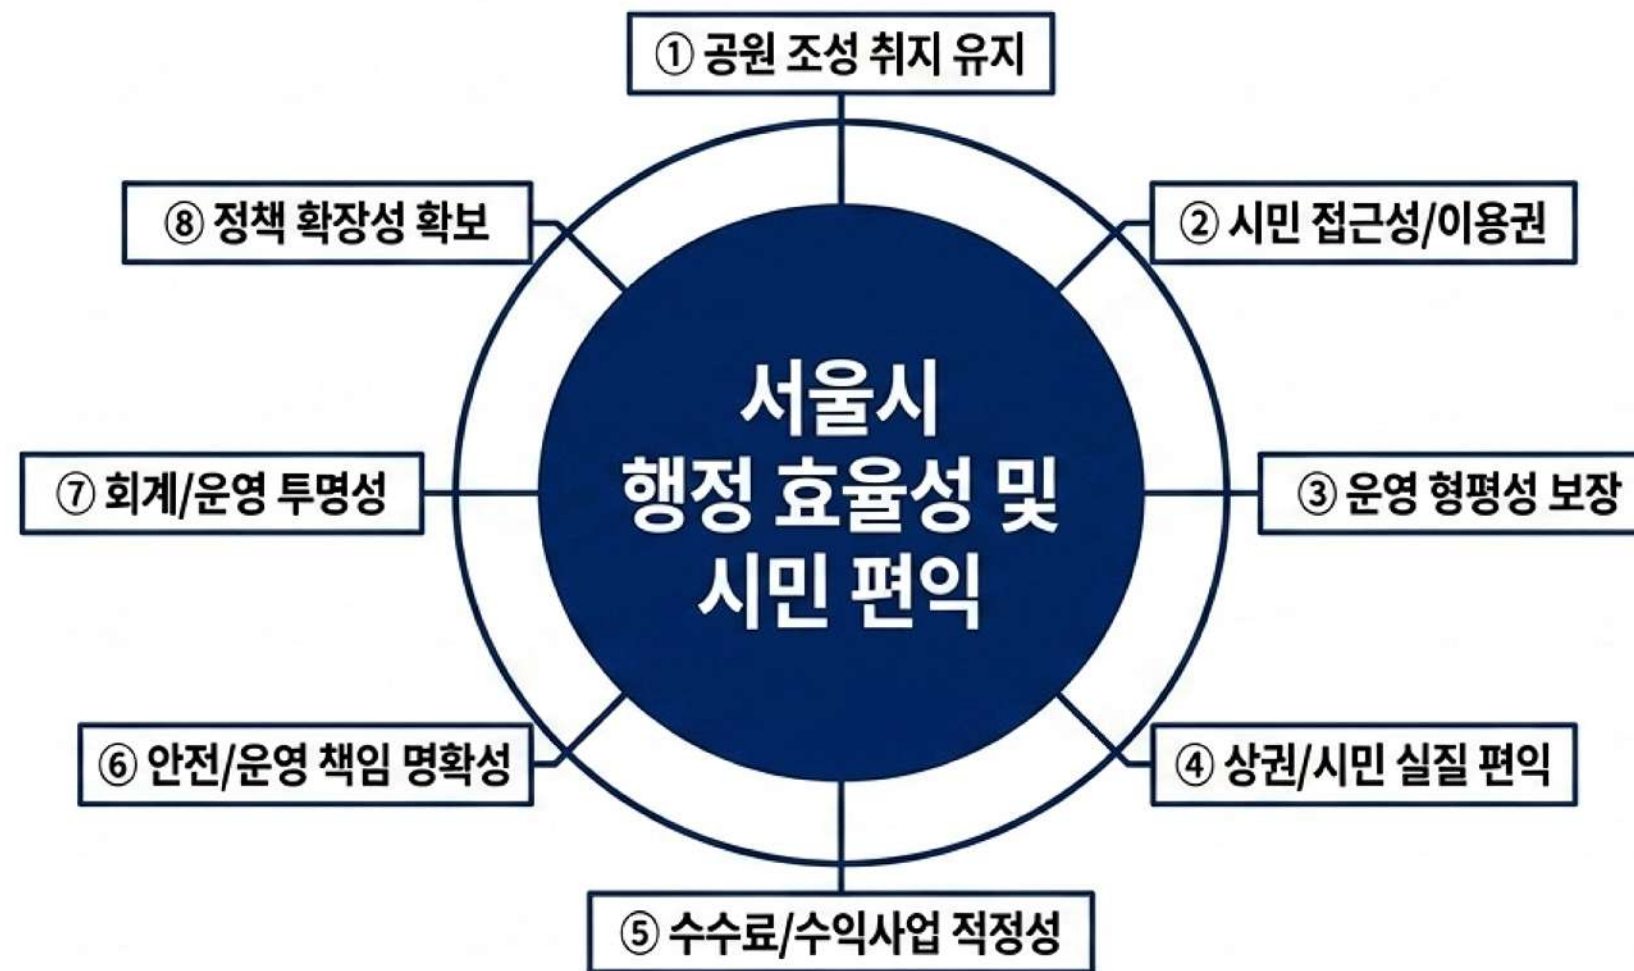

이지스의 상업적 이익 관점이 아니라, 공공 편익과 행정 원가 절감을 최우선 어젠다로 포지셔닝하여 서울시 행정 협력을 이끌어냄

Chapter 1-4

핵심 전략 및 가이드라인

우리가 답변할 수 있어야 하는 것들

핵심 선결 질문을 세우고 이에 답할 수 있는 결과물을 만든다

문제 정의와 차별성 Core Problem		시공간 및 서비스 설계 Service Design		역할 분담 및 자원 구조 Operations		성공 기준과 전이 조건 Success Metrics	
Q1	송현에서 궁극적으로 해결하려는 가장 중요한 문제는 무엇인가?	Q4	어떤 공간에서, 어떤 시간대에, 누구를 위한 서비스를 제공할 것인가?	Q6	사고·시설·민원·프로그램 실패에 대한 주체별(서울시, 이지스, 기업) 책임은 누가 부담하는가?	Q9	서울시와 이지스 및 참여기업은 각각 무엇을 '성공'으로 정의하는가? (시민과 상권의 체감 변화)
Q2	기존 도시행사·상인회·도시재생사업과 송현형 BID의 본질적 차이는 무엇인가?	Q5	상시 서비스와 일회성 프로그램을 어떻게 구분하고 준비할 것인가?	Q7	운영주체는 협의체, 위탁사, 별도 법인 중 어떤 형태가 가장 적합한가?	Q10	다음 단계(SBD)로 확대하기 위해 반드시 '확인되어야 할 지표'는 무엇인가?
Q3	시민이 체감해야 할 최소 변화와 서비스의 가장 큰 차별점은 무엇인가?			Q8	초기비용과 반복 운영비는 얼마이며, 공공·민간·자체수익 비율은 어떻게 분담하는가?		

기획 단계의 모호한 수사는 지양하고 재무 원가, 법무 책임, 정량 KPI가 포함된 필수 질문에 대한 답을 이끌어낼수 있게 준비


“플레이스메이킹 - 에리어매니지먼트 - BID”의 개념과 계층적 연계

콘텐츠-공간-사업운영 모델을 수직 통합

플레이스메이킹

공간과 콘텐츠의 창출


시민이 체감하고 이용할 수 있는
매력적인 물리적 공간과
콘텐츠 중심의 현장 구현.
(단순 이벤트 지양)

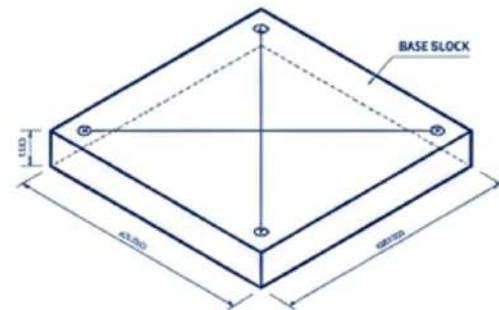

에리어 매니지먼트

지역 단위 서비스 묶음


개별 공간과 콘텐츠를 넘어,
권역 전체의 서비스와 유지 관리를
유기적인 하나의 지역 단위로 통합.

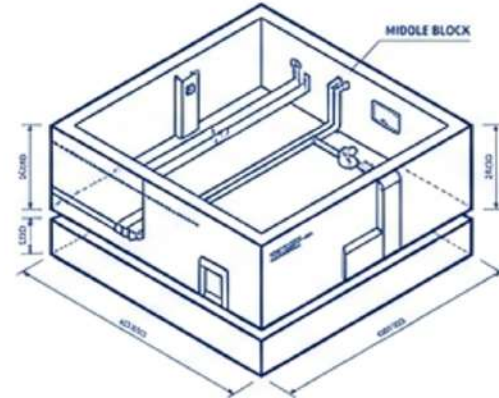

BID

민관 거버넌스 및 사업모델


공공기관(서울시)과 민간(이지스,
기업)이 함께 구조를 설계하고
책임지는 최상위 운영 사업모델.

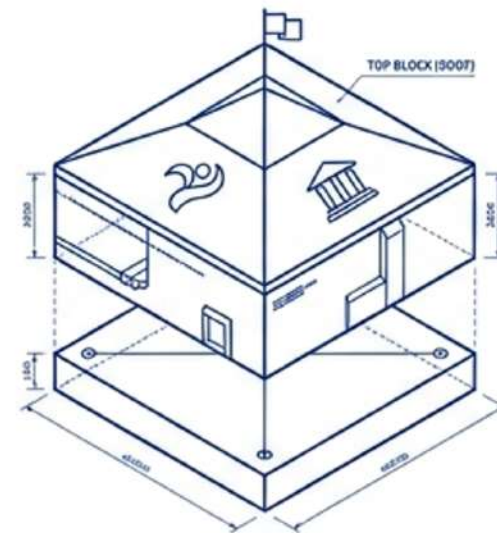

수직 통합 스택

Songhyeon Unified Stack

플레이스메이킹이나 BID 중 하나를
택하는 개념이 아니며,
장소(공간) - 연계(서비스) - 주체(거버넌스)가
하나의 모델로 수직 통합되어
작동해야 함.

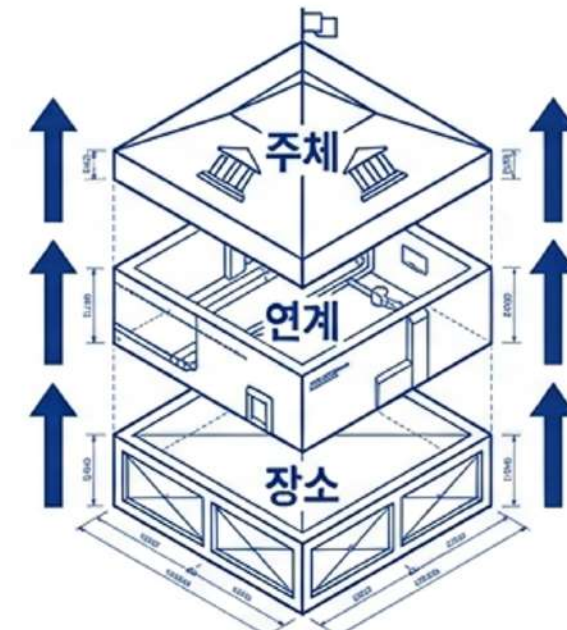

플레이스메이킹과 BID는 서로 배타적인 선택 개념이 아니며

시민 공간 구축(서비스기획)을 비즈니스 지속성(사업+운영)과 결합하는 단일화된 수직 통합 체계이다

서울시 공동 파트너십 구축을 위한 가이드라인 수립

파트너십 및 거버넌스	가치 연결 및 사업성	실행 및 실증 스케일	평가 및 데이터 기준
공공 주체와의 사전 조율	민간 협력의 공공성	점진적 MVP 모델	철저한 객관성 확보
1 서울시는 단순 승인기관이 아닌 공동 파트너. 초기부터 협력 및 역할 필수 정의.	3 기업 참여는 반드시 공공가치와 연결. 단순 스폰서 노출이나 사적 기업행사 전략 방지.	5 처음부터 대규모로 시작하지 않음. 최소 서비스 패키지(MVP) 실행 후 성과에 따라 확대.	6 사전 기준값(방문객, 체류시간, 만족도, 민원 등) 수립 및 통제.
2 기본 행정서비스와 민간의 추가서비스를 명확히 구분하여 민원 및 행정책임 논란 사전 예방.	4 세부 운영조건(비용, 인력, 안전, 시설, 인허가)이 담보된 공간과 콘텐츠 기획.		7 사실과 가설의 엄격한 분리. (해외사례 성과를 송현의 확정 효과로 동일시하는 오류 차단).

서울시와의 행정적 마찰을 예방하고 **공적인 협력 구도를 확보**하기 위한 현장 가동 가이드라인 수립

거시 마스터플랜은 지양하고 송현 실증 MVP를 우선


서울역-남산 SBD 사업	HIGHLIGHTED 송현 BID 실증 사업	현재 단계의 오판 위험	HIGHLIGHTED 핵심 결론
장기적 비전과 리스크 이지스가 에리어 매니지먼트를 검토하는 궁극적 장기 목표. 다수 소유자 동의, 법정 부담금 징수, SBD 임차기업 유치 등 광역 단위의 고난도 난제 포함.	단기적 실행과 검증 SBD의 단순 물리적 축소판이 아님. 반복 가능한 실무협력 관계 구축, 공공-민간 협업 프로토콜 및 운영 서비스 품질을 실제로 증명하는 첫 관문.	무모한 과속 예방 TF가 당장 SBD 전체 마스터플랜의 무결성을 완성하려 하거나, 송현의 성과를 광역 권역의 사업성으로 설불리 확대 해석하는 것을 경계.	실행 가능한 모델 안착 현재 TF의 절대적 우선순위는 마스터플랜 완성이 아니라, 송현 권역에서 '실제로 작동하는 에리어 매니지먼트 체계(BID 모델)'를 안착시키는 것임.

실제 현장에서 완벽하게 작동하는 최소 단위의 에리어 운영 표준(SOP) 초안 검증

PART 2. Action Plan

마일스톤 및 평가 지표

명확한 성과 확보를 위한 7대 순환 마일스톤

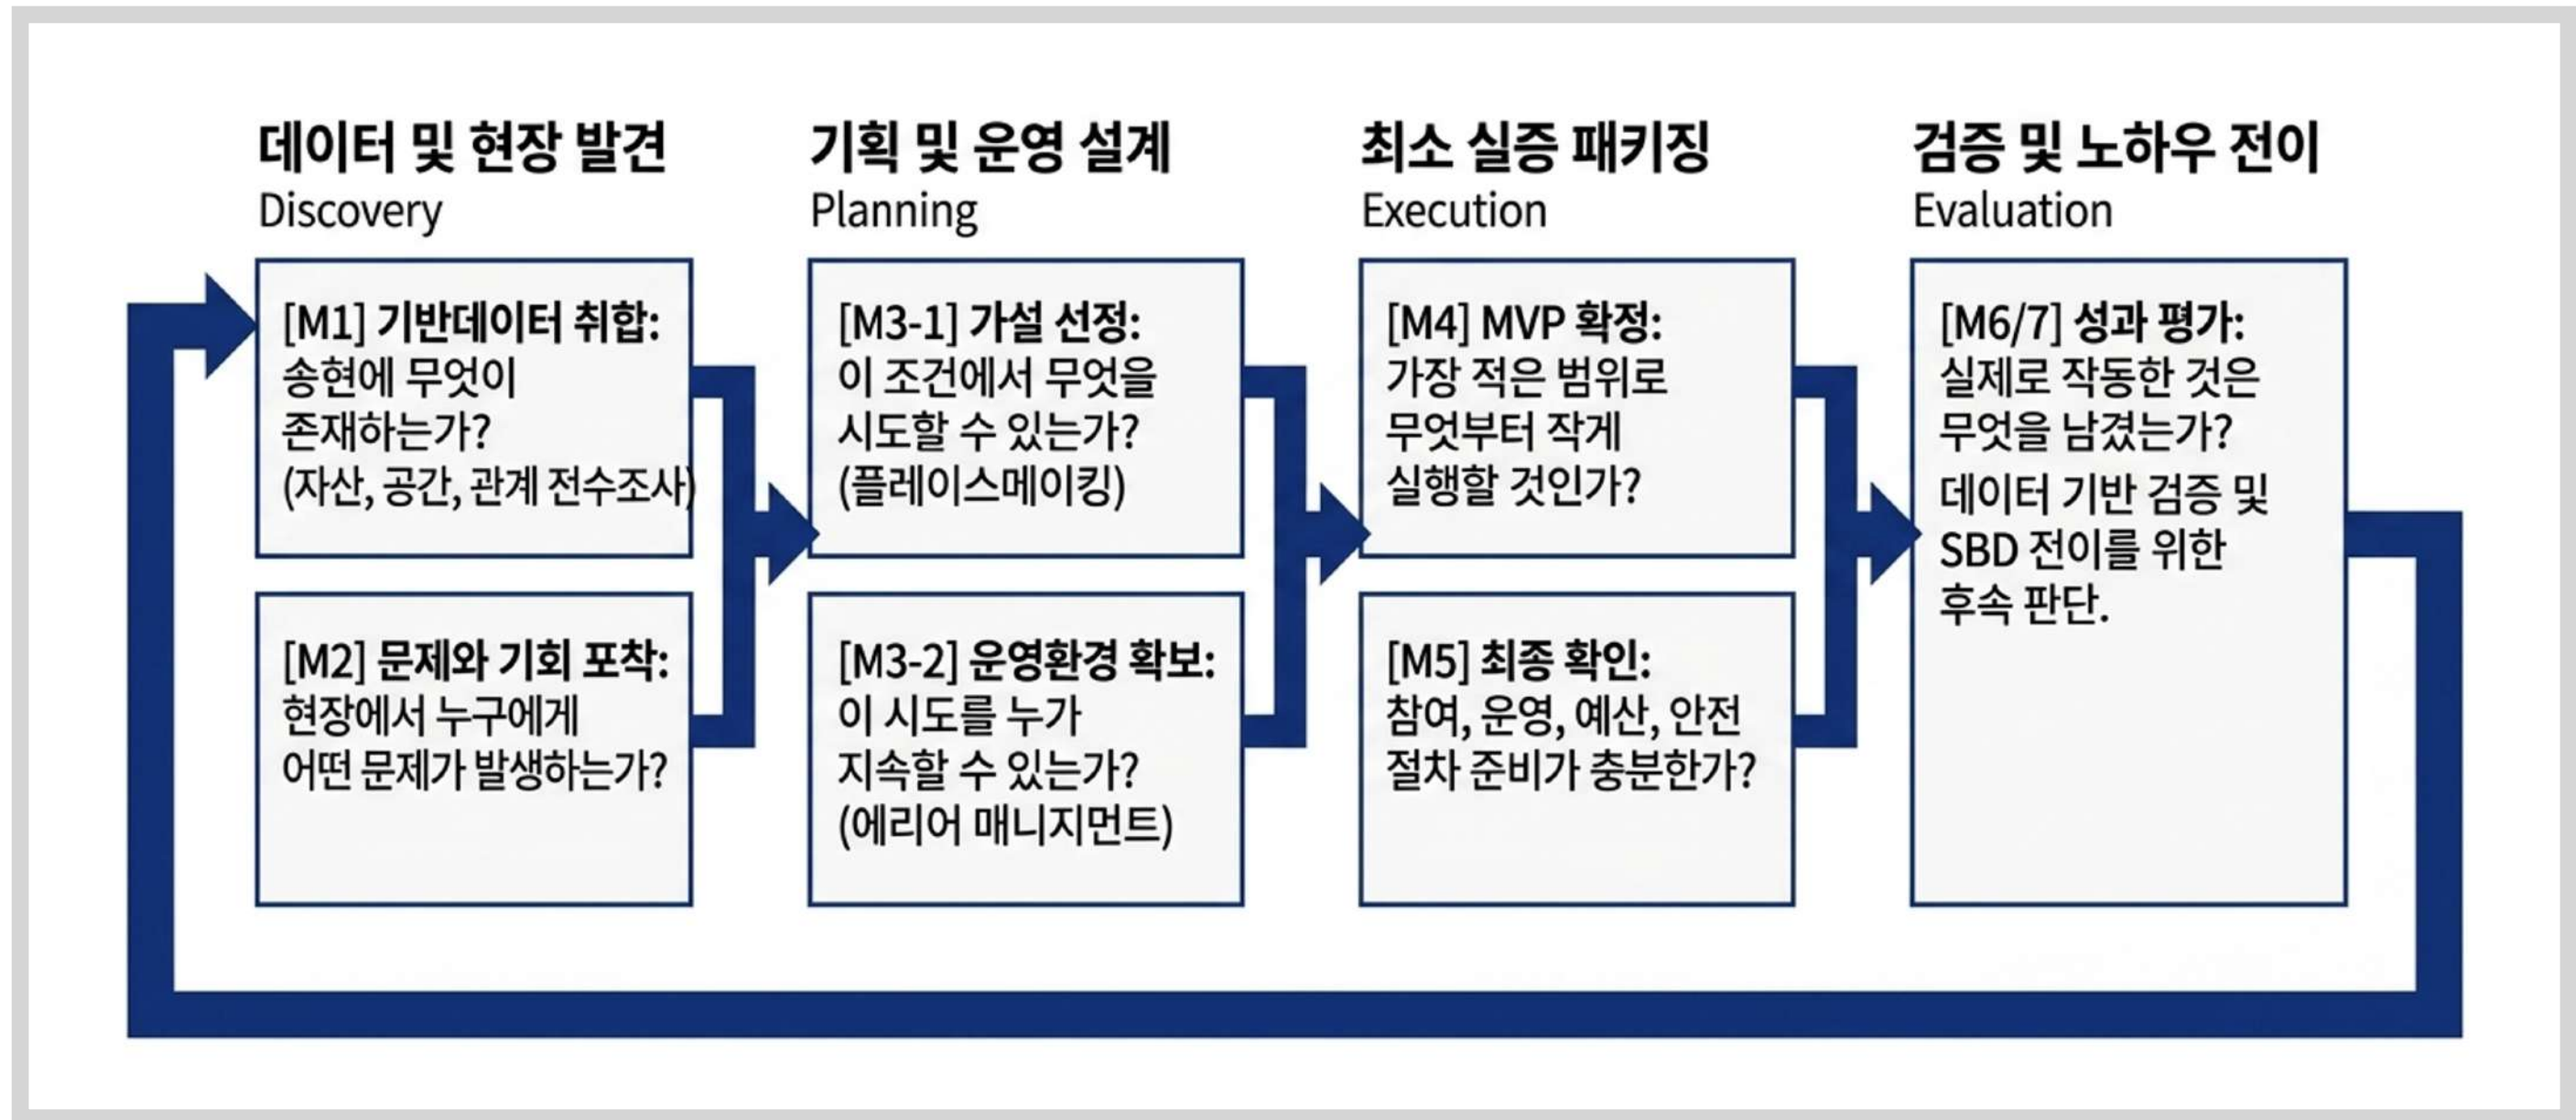

프로젝트의 전 과정을 순환 마일스톤으로 세분화하여 관리하고 단계별 체계적인 프로젝트 관리 체계 확보

Milestone 1. 송현에 뭐가 있나

Back Data 취합/분석

우리가 실제로 가질 수 있는 자산, 공간, 관계, 서비스 재료는 무엇인가

송현 권역 인접 내외부 자산 및 공간을 전수 조사함

조사 범위: 송현동 이지스 부지 중심 000m 권역 기반 데이터 통합



이지스 자산 전수조사
IGIS Assets

송현동 자산 정보
(리테일 포함), 쌈지길,
안녕인사동, 도화서길 등
자산 관계유형, 면적,
용도, 운영주체 파악.



인접 공공공간 실태
Public Spaces

열린송현녹지광장,
인접 공원, 광장,
핵심 보행축 및 도로망,
공개공지 현황
데이터화.



상권 및 리테일 인프라
Retail & Comm.

권역 내 리테일 상점
정보(유형, 개수, 통계),
상인협의회 등 기존
공동체 정보,
문화 행사 운영 자료.




지자체 계획 및 마스터플랜
Master Plans

범위 내 서울시 및
종로구 관련 개발/운영
계획, 인허가 기준.
(원문 출처, 작성일,
링크 등 철저한 교차
검증).

인접 권역 전체의 내부 및 공개 자료를 전수 탐색하여 장소 가설 설계를 위한 통합 백데이터 아카이브를 구축한다

주체별 협업 및 통합 기준선 수립

주체별 현장 리서치 R&R 및 공통 기준 수립

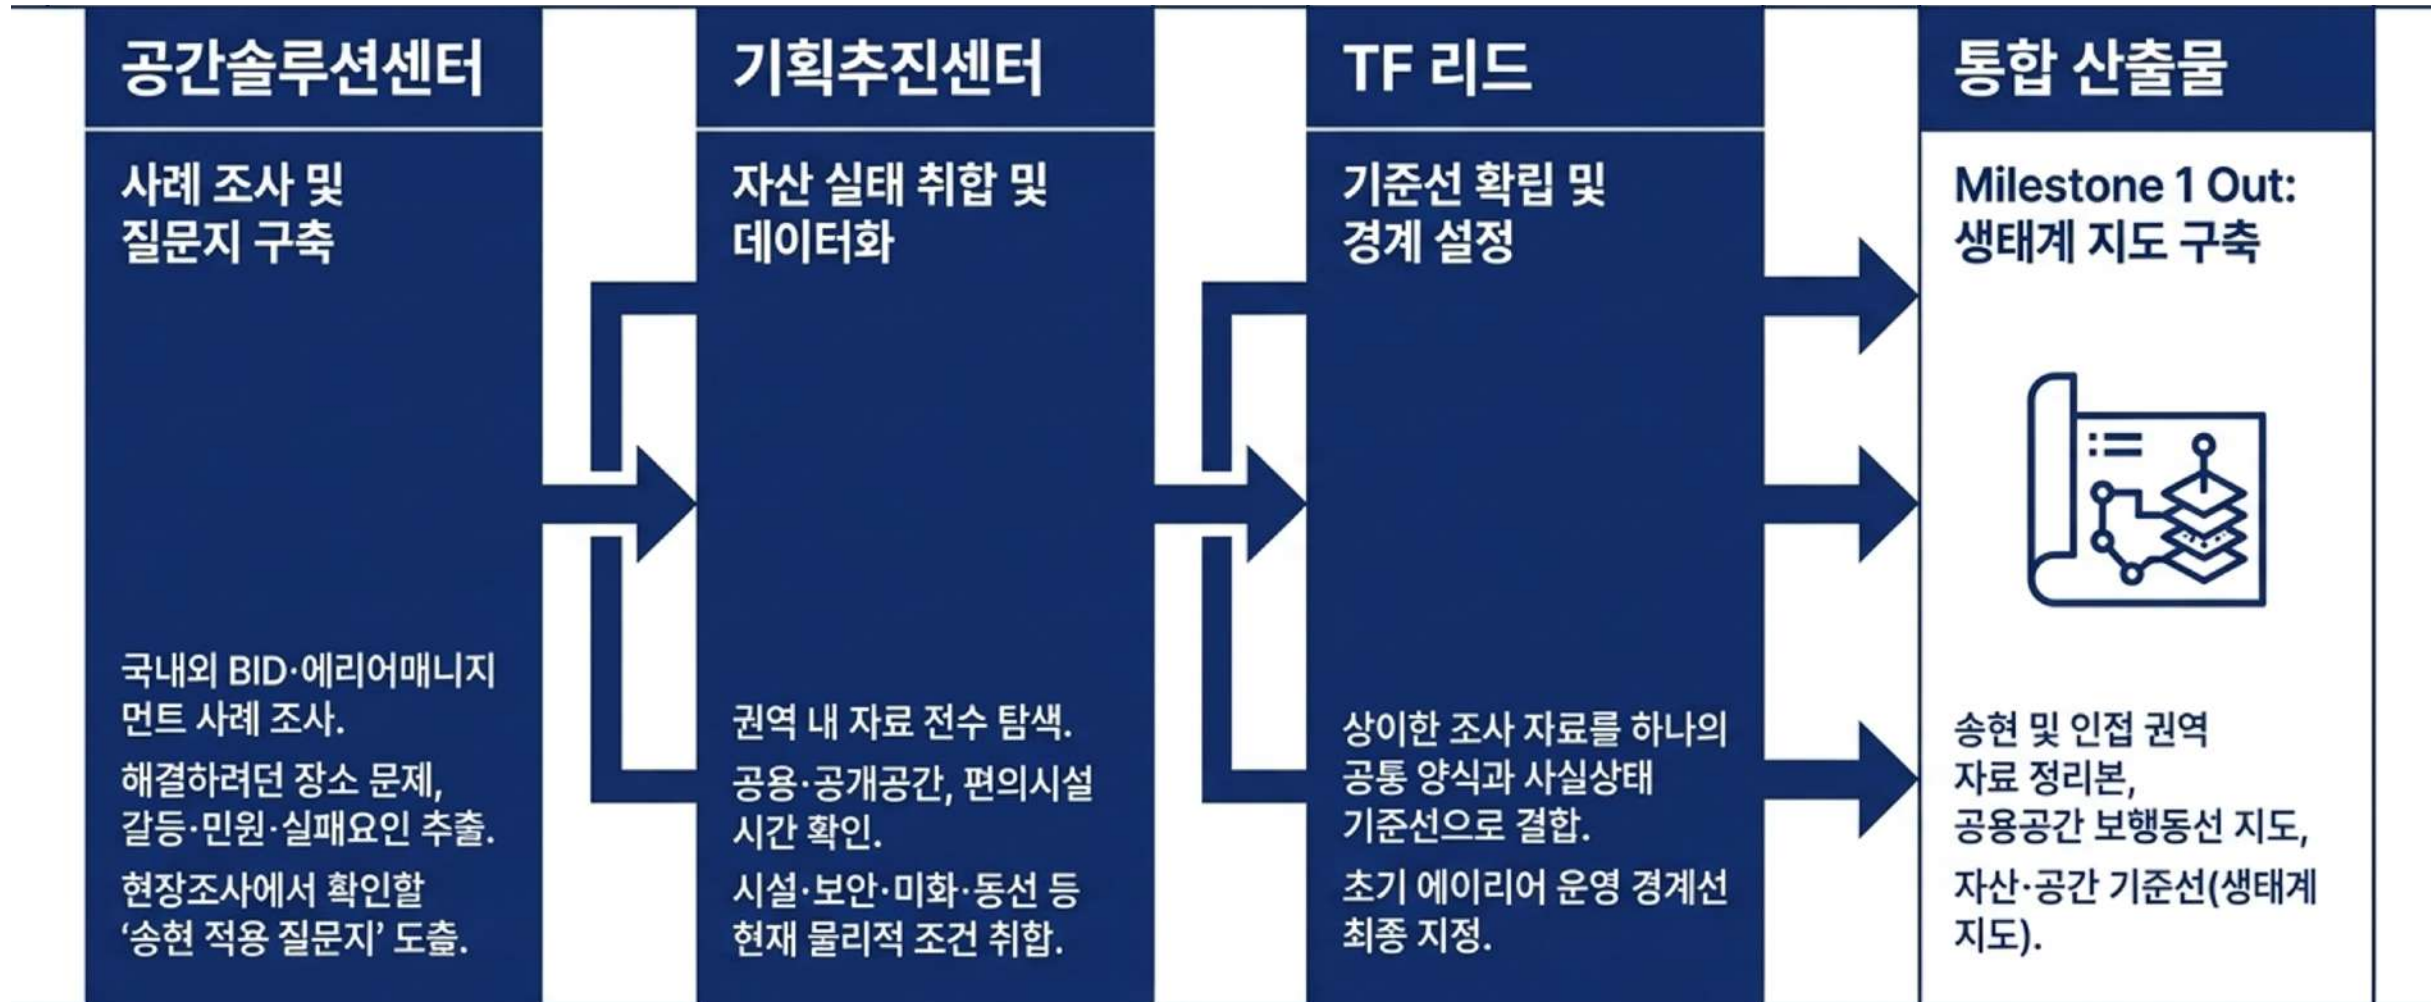

기반데이터 전수 조사를 위한 공솔·기획추진 간 R&R 유기적 융합, 체계적 사실관계 기준선 수립

Milestone 1 완료 판단

‘무엇이 있고 누가 있고 어디에 연결되어 있나’를 한눈에 확인

			
Gate 1. 자산 및 공간 구분 사실상태 구분 완료 여부 송현에 무엇이 있고, 누구와 연결되어 있는지 명확한가? 핵심 자산과 공공공간의 관계, 그리고 ‘무엇이 비어 있는지’가 생태계 지도로 도출되었는가?	Gate 2. 질문지 전환 사례의 실무적 전환 단순히 모아놓은 국내외 사례 리포트가 송현 현장에서 직접 확인하고 검증할 ‘구체적인 질문 리스트’로 완벽히 전환되었는가?	Gate 3. 현장 인터뷰 준비 관찰 실행 준비 상태 도출된 생태계 지도와 질문지를 바탕으로, 즉각적인 현장 관찰과 이해관계자 심층 인터뷰를 시작할 수 있는가?	판단 결과 (Go / No-Go) 마일스톤 통과 판정 위 3가지 조건이 모두 충족되어야 마일스톤 2(문제와 기회 포착) 단계로 진입. 불충족 시 보완 후 재검토.


문제정의/기회포착의 2단계 마일스톤 진입을 위한 백데이터를 한눈에 식별할 수 있는 상태로 1단계 공식 완결

Milestone 2. 어떤 불편/만족을 겪나

리서치 기반 문제 정의 및 기회 포착

실제 이용 정성·정량 경험 데이터 수집

정성·정량 경험 분석 기반으로 실무 기회 포착

정량적 이용 현황	정성적 이용 경험	사용자 여정 지도 (Journey)	기회 포착 (Opportunity)
현장 트래픽 추적 실제 방문객 수, 특정 공간별 체류 시간, 리테일 매출액, 시간대별 인구 밀집도 등 현장 서비스의 정량적 이용 실태 측정.	만족 및 불편 인식 특정 장소, 특정 시간대에 누구에게 어떤 문제가 발생하는가? 시민, 상인, 입주사의 정성적 불편 사항 및 만족도 파악.	경험의 시각화  시민·방문객·입주사·리테일 운영자의 이동 경로를 작성. 활성/비활성 공간, 이동 단절 구간, 체류 불편 지점 도출.	잠재 수요 연결 해외 사례에서 분석한 문제 해결 모델이 송현에서도 유효한지 교차 검증하여, 잠재 서비스 개입 지점 확정.

장소 이용의 직접적인 현장 정량 성과(트래픽, 매출)와 정성적 경험 만족도를 분석하여 기회 영역을 도출한다

현장 경험 조사 및 자산별 운영 현황 파악

사용자 서비스 이용 여정 및 자산 운영 현황 파악

공간솔루션		기획추진	
현장 관찰	파트너 관찰	계약 확인	심층 인터뷰
정량/정성 현황 파악 트래픽, 이용객 성과 및 만족도 파악. 사용자 여정 작성 및 이동 단절, 관심사 등 문제/요구사항 도출.	운영 자원 파악 복수 운영파트너사 접촉을 통한 서비스 여건 파악. 공간·콘텐츠·인력·재원 등 제공 가능한 자원 정리.	시설 및 운영 제약 공간솔루션 기획업무 지원. 이지스 자산의 시간대별 운영/이용행태 및 시설·안전·보안·민원 이슈 현장 조건 확인.	관계자 인터뷰 지원 미화, 보안, 리테일 운영자 등 현장 관계자 심층 인터뷰 필요시 업무 지원 및 공공 적합성 확보 검토.

공솔의 경험 설계 업무와 기획추진의 하드웨어 리스크/행정 지원 업무 연계하여 조사 완결성 확보

리서치 종합에 따른 우선 실행 기회영역 도출

대상·시간·장소별 분류로 기회영역 가설 초안 수립

장소별 재분류 재분류 Space:	대상별 재분류 재분류 Target:	시간대별 재분류 Time:	3~5대 기회영역 초안 Lead 의사결정  
물리적 개입 지점 공공공간, 이지스 부지, 인접 보행축 등 문제와 수요가 발생하는 정확한 물리적 위치 데이터.	핵심 이용자 그룹 일반 시민, 오피스 입주사, 리테일 방문객, 관광객 등 페인포인트를 겪고 있는 명확한 타겟 규명.	시간적 개입 조건 주간/야간, 평일/주말, 특정 피크 타임 등 시간 흐름에 따른 수요 변화 및 운영 제약 조건.	

현장 팩트 데이터와 파트너사의 실제 가동 가능 자원을 연계하여, 실행 판단을 내릴 수 있는 기회 제안서 초안을 완성한다


어디에서 누구의 어떤 경험을 개선해야 하는지, 근거 확보

			
Gate 1. 직접 근거 Evidence: 장소·대상·시간 근거 어떤 장소에서 누구의 어떤 경험을 개선해야 하는지 명확한가? 그 판단의 '직접적인 데이터 근거'를 객관적으로 설명할 수 있는가?	Gate 2. 경험 개선 UX: 문제 해결 타당성 해결하고자 하는 현장의 문제와 그에 따라 기대할 수 있는 장소경험의 변화가 직관적이고 충분히 설명되는가?	Gate 3. 우선순위 Priority: 기회영역 선정 근거 도출된 수많은 문제 중, 우선 검토 대상 3~5대 기회영역을 선정한 논리적 근거가 명확하게 수립되었는가?	Gate 4. 가설 연계 Next Step: 다음 단계 설계 가능성 확보된 기회 초안을 바탕으로, 다음 단계(마일스톤 3)의 구체적인 플레이스메이킹 시도(가설)를 설계할 준비가 완벽히 되었는가?

Milestone 3. 현 조건에서 무엇을 시도할 수 있나

서비스 가설 설계 및 운영체계 구축


목표 경험을 정의하고 운영 주기 분리하여 체계적 가설 설계

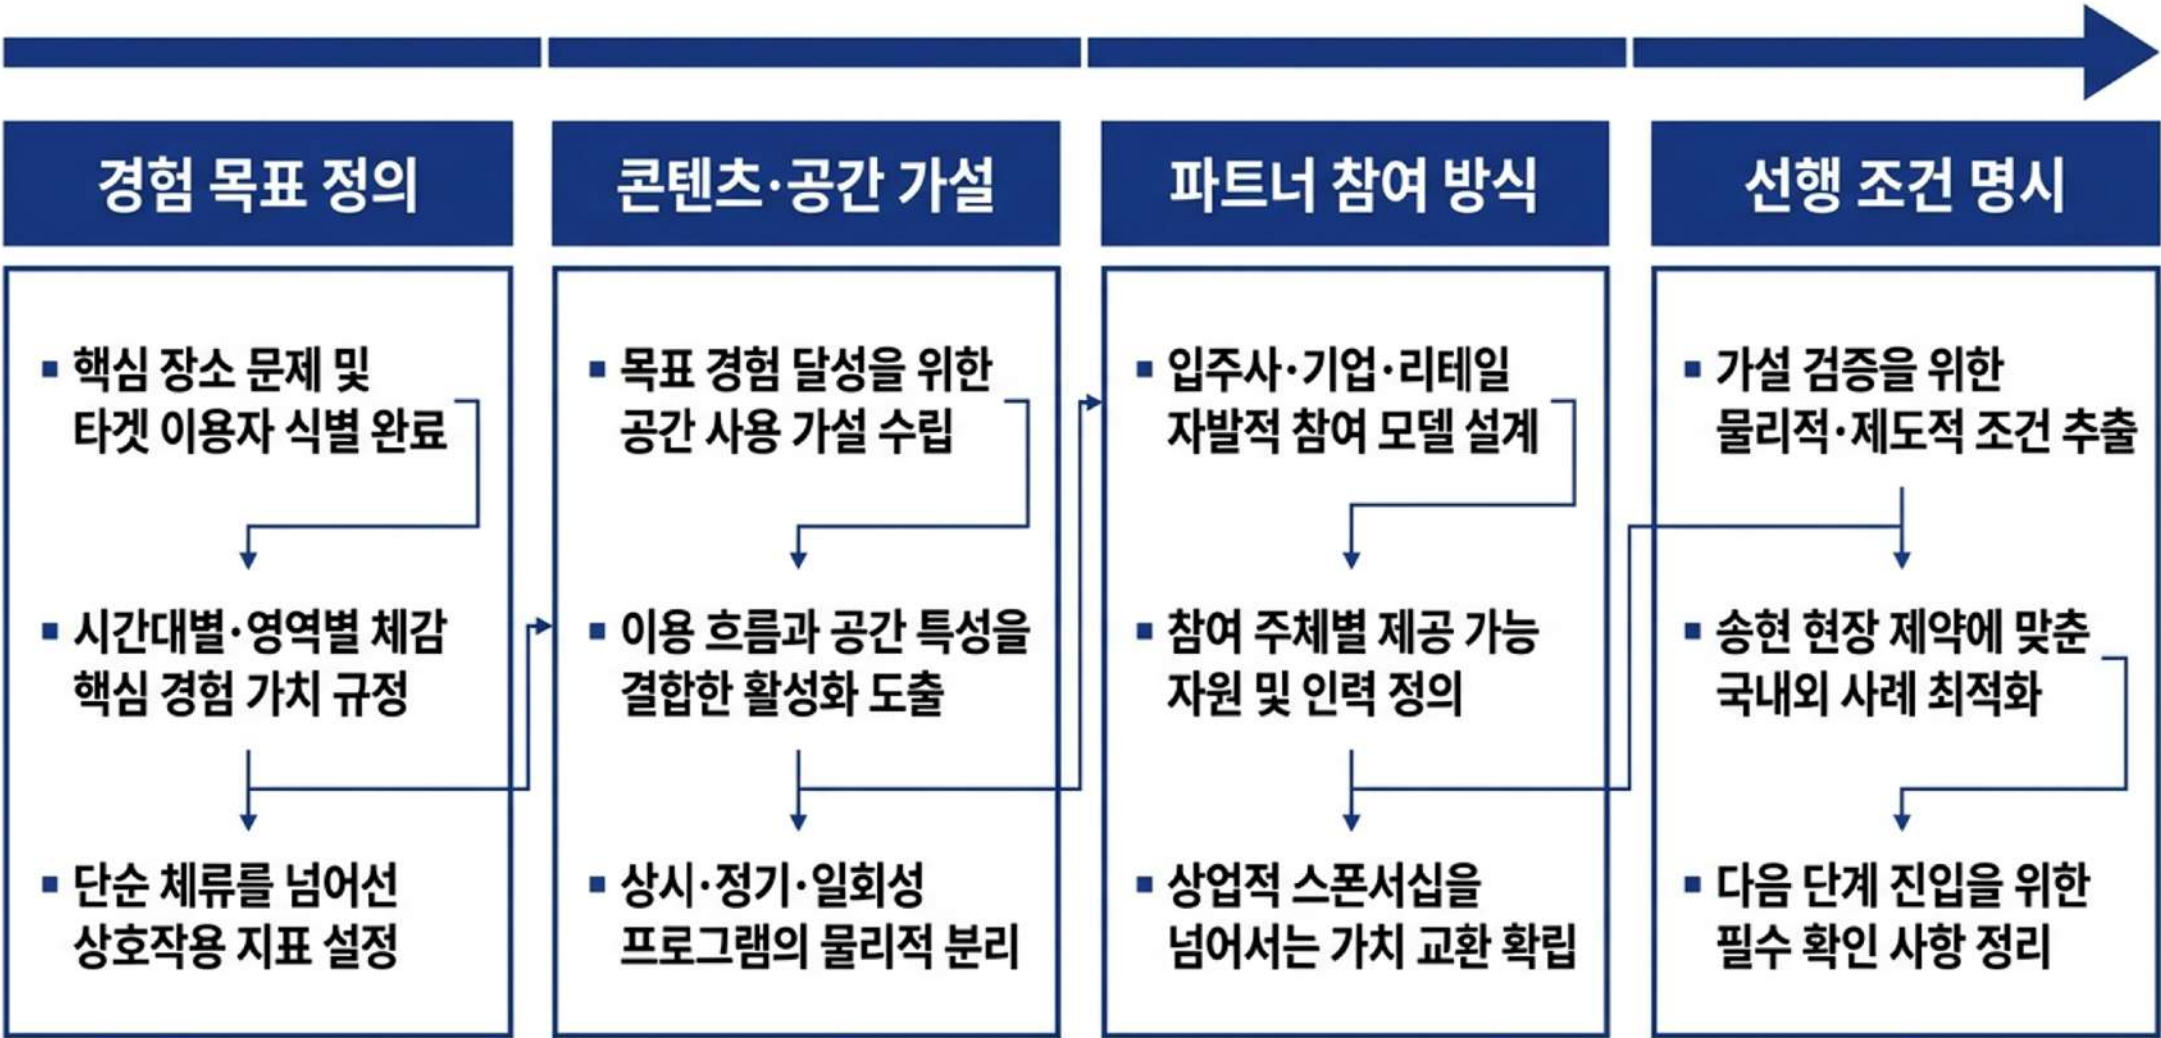

장소 가치를 가시화하기 위해 제공할 공간 경험의 구체적인 구현 방식과 운영 주기를 입체적으로 분할 설계


“이지스 실물 자산 가치 제고 + 서울시 공공 가치 창출” 병합 전략 수립

서울시 공공 운영 원리와 서비스 가설을 결합

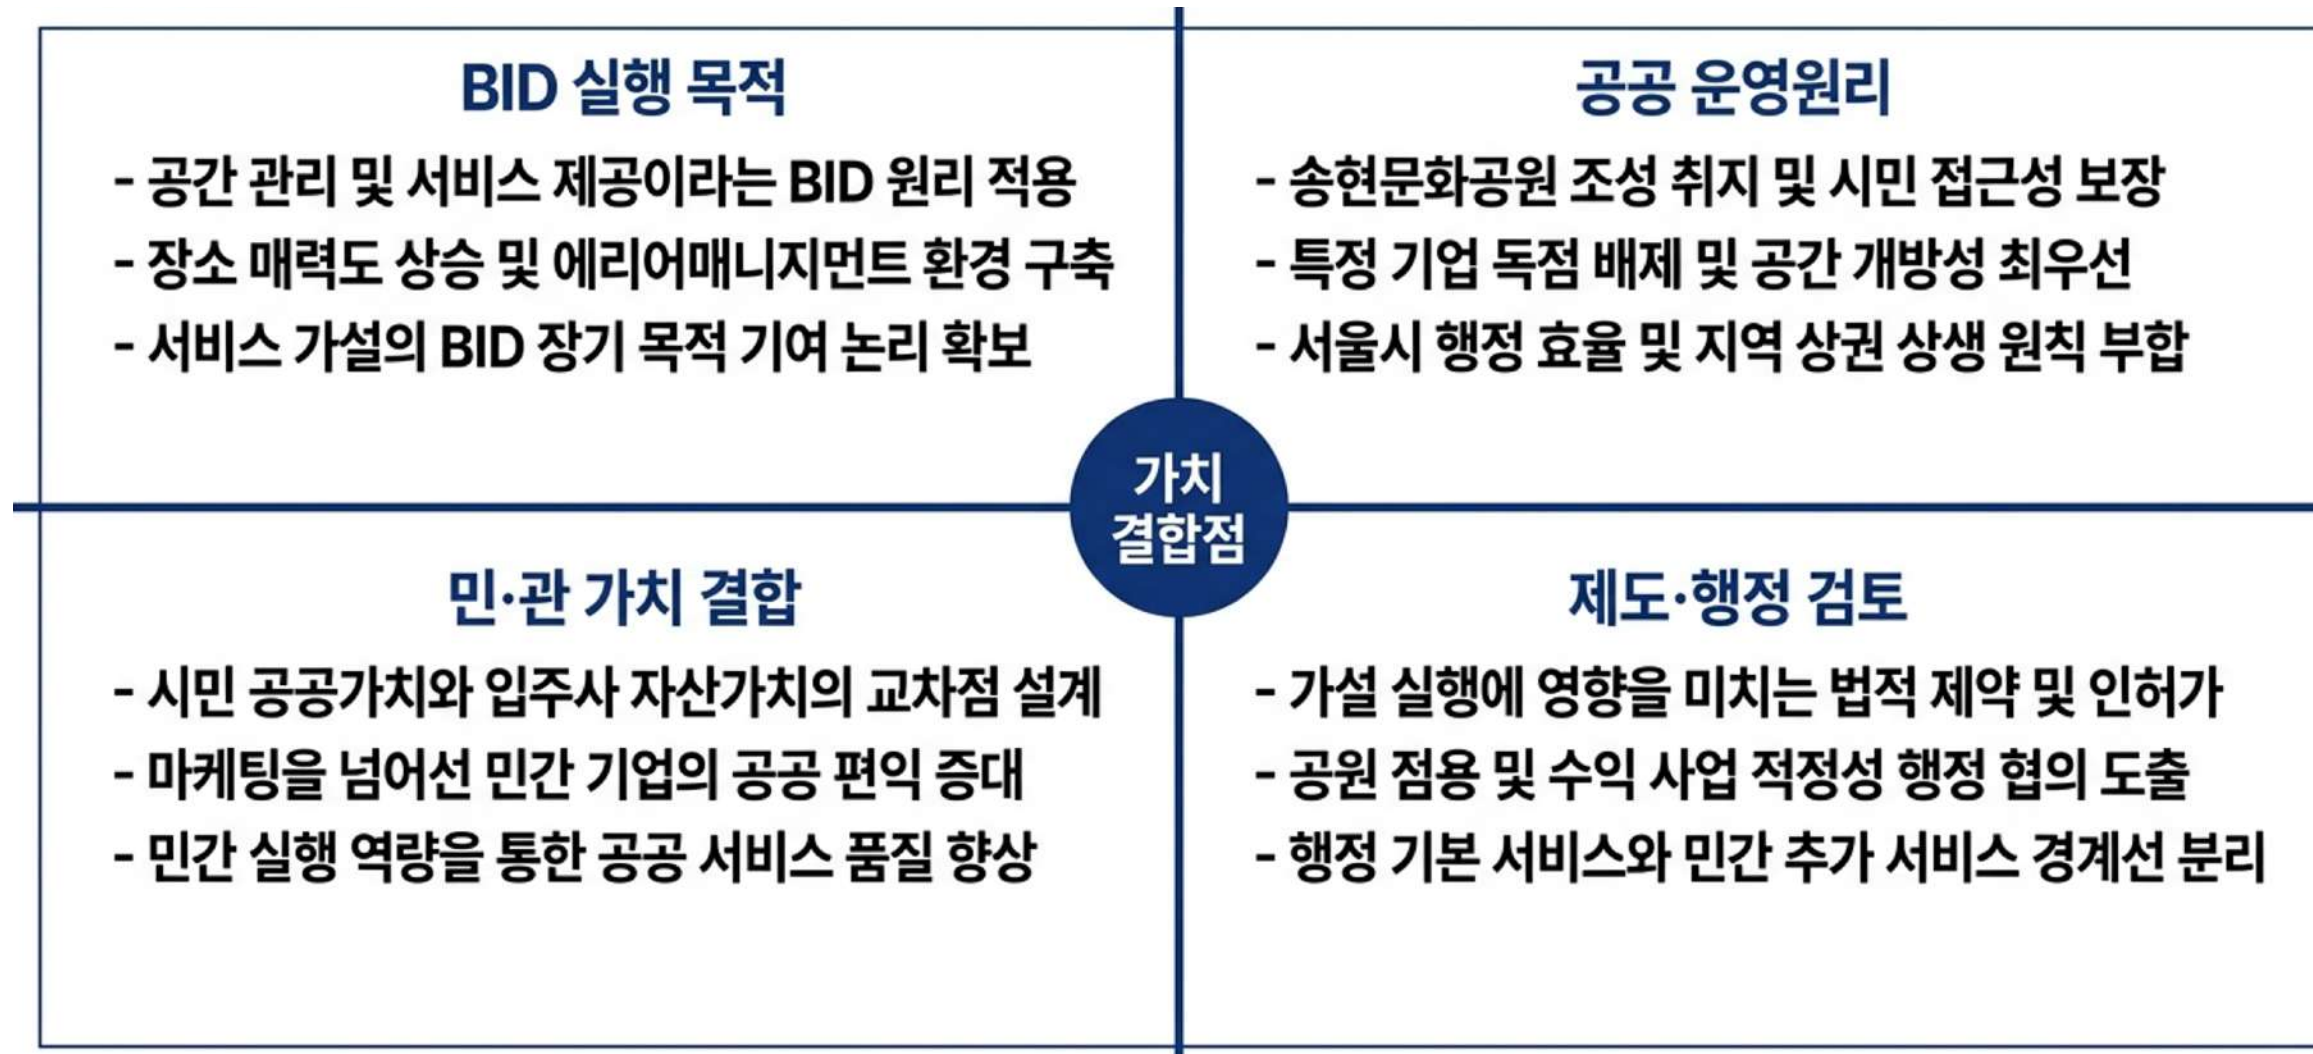

민간 자산만의 가치 제고 목적을 배제하고, 공공의 행정 목표와 장소의 사적 가치가 상호 교차하는 협력 구도를 형성한다

우선 검증을 위한 핵심 실증 가설 구조화

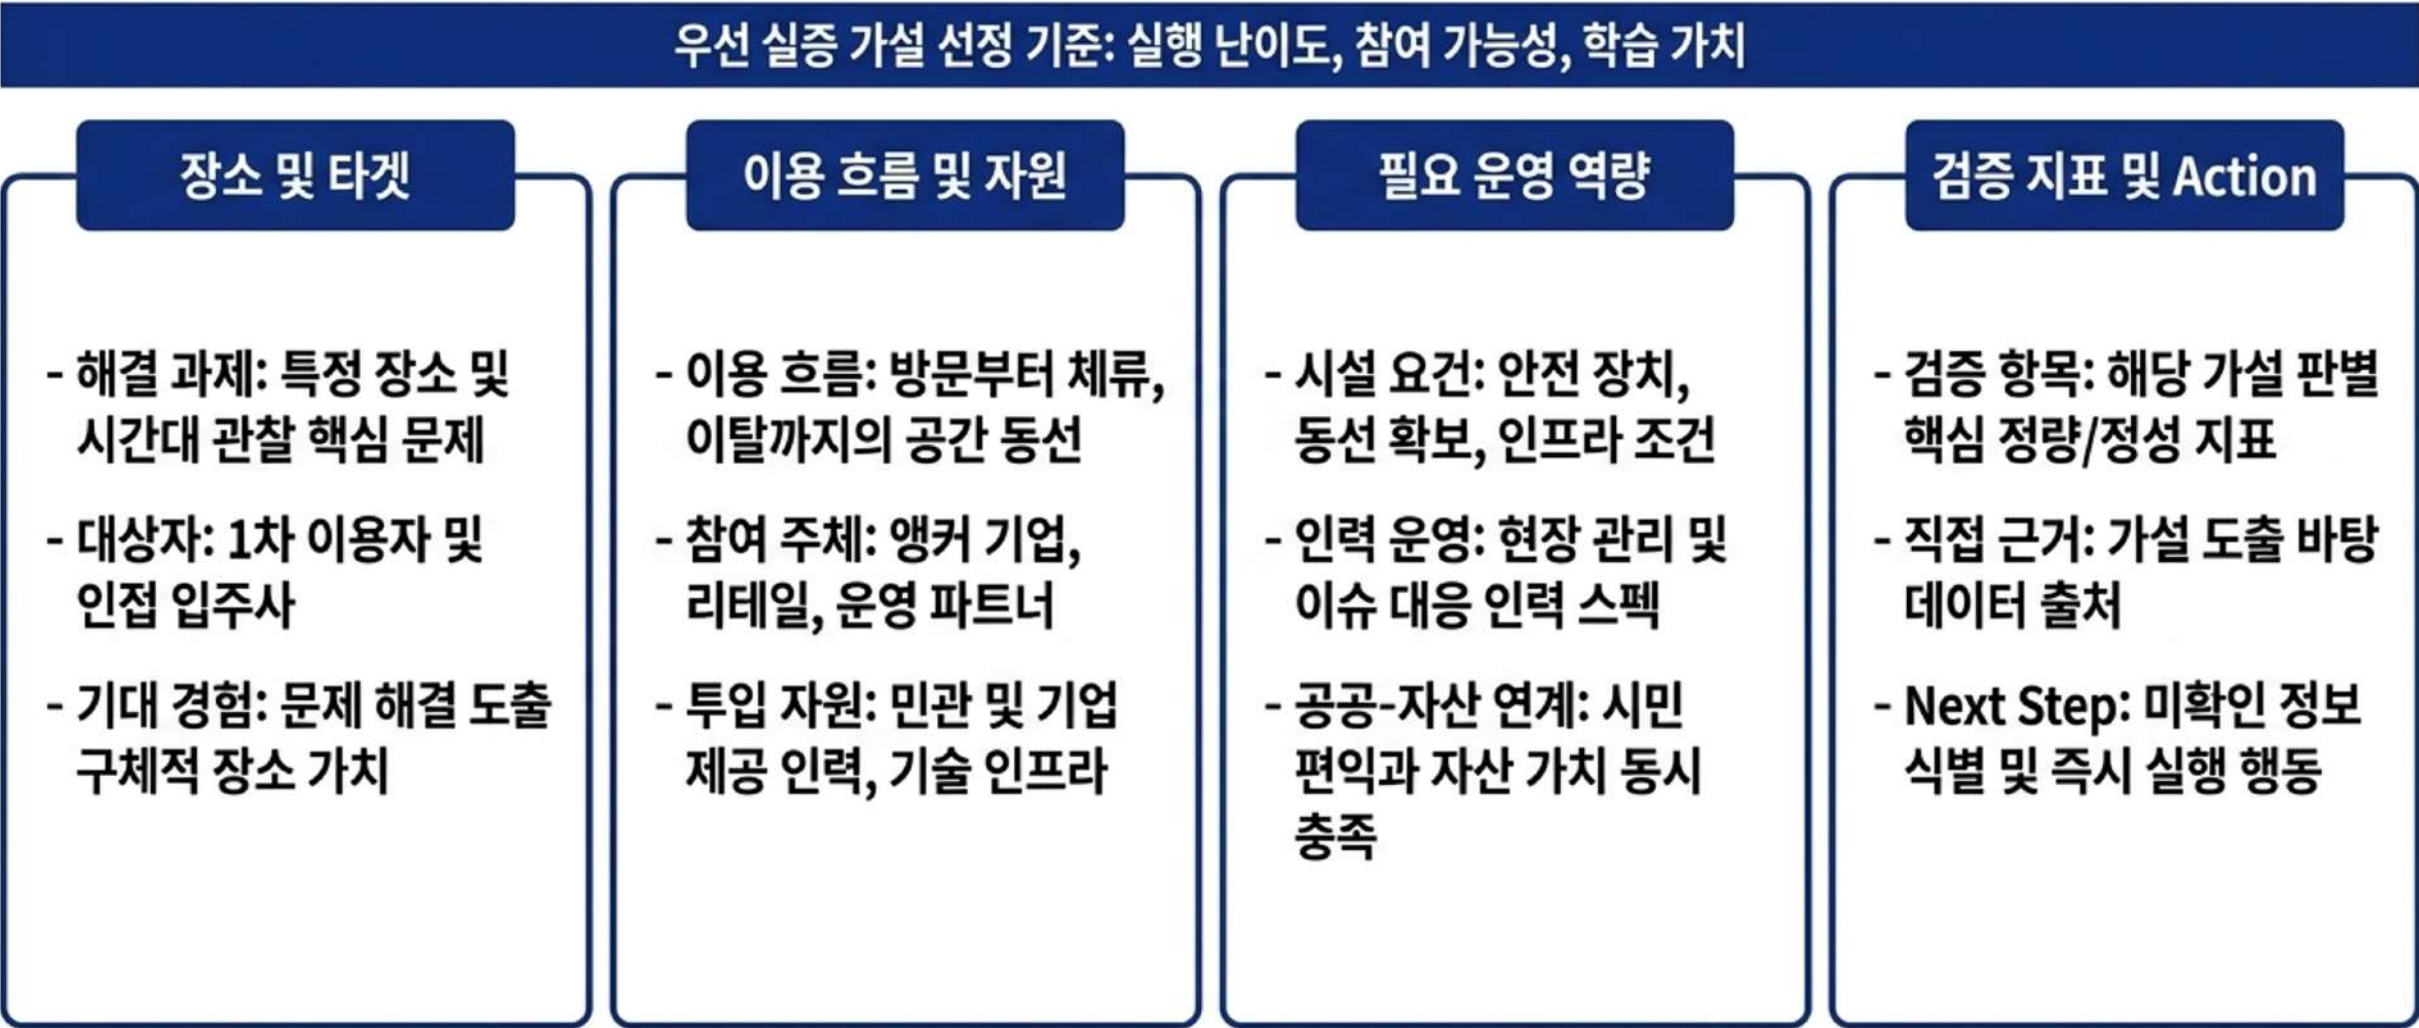

검증 가치가 가장 높은 가설을 선별하여 대상, 제공 자원, 검증 지표를 카드 형태로 사전에 정밀하게 정형화

안정적 공간 통제를 위한 현장 오퍼레이터 및 자산 운영 조건 조율

지속가능 현장 운영을 위한 통합 거버넌스 모델 수립

공간 사용 및 동선 제어

- 실증 구역 내 공간 사용 범위 및 물리적 제약 요건 확정
- 방문객 트래픽 고려 안전 동선 및 시간대별 개방 체계
- 자산별 운영 미치는 영향 분석 및 필수 승인 절차 검토

운영 주체 및 파트너

- 기업 및 외부 파트너 참여 의사 및 협업 조건 확정
- 현장 인력 및 전문 파트너 간 역할(R&R) 명확화
- 참여 주체의 제공 자원을 실제 현장 운영 업무로 매핑

자산 관리 및 현장 인프라

- AM 관점의 시설 유지, 미화, 보안 요건 및 기준 확인
- 공공공간 운영 필수 현장 지원 사항 및 인프라 조달
- 장비 반입 및 설치에 따른 시설물 보호 규정 확립

리스크 및 절차 대응

- 현장 발생 가능 안전사고 및 민원 대응 시나리오 설계
- 보험 가입 조건 확인 및 사고 발생 시 책임 소재 규명
- 서비스 수준(SLA) 정의 및 현장 운영 절차(SOP) 수립

기획의 참신함 뒤에 숨은 시설 파손, 현장 민원, 인허가 리스크를 예방하기 위해 오퍼레이터와 자산운영 부서 간의 책임 한계를 사전 조율

민관 협업 아젠다 및 다채널 커뮤니케이션 플랫폼 구축

플랫폼	이용자 소통 플랫폼	운영 데이터 플랫폼
	▪ 이용자 피드백 수집 기반 장소 경험 개선 오프라인 채널 ▪ 운영 참여자 간 상시 정보 교류 정책 수립 및 가동	▪ 서비스 가동 현황, 트래픽, 민원 발생 이력 실시간 기록 ▪ 데이터 기반 현장 이슈 즉각 대응 및 사후 분석 환경 구축
행정/협업	서울시 협업 아젠다	법무 및 행정 절차
	▪ 서울시 부서별 협의 필요 항목 및 타임라인 맵 구축 ▪ 공공가치 정합성 근거 기반 민관 합동 회의체(TF) 운영	▪ 공간 운영 가설 영향 조례, 점용 허가, 인허가 절차 확인 ▪ 수익 사업 및 회계 처리 투명성 확보용 제도적 방어선 구축

방문객 접점을 실시간 데이터 수집 통로로 변환하고, 서울시와의 정기적인 행정 조율 일정을 완편하여 대외 리스크를 최소화

실증 타당성 판정을 위한 최소 실행 패키지 및 예산 드래프트

MVP 실행 판단을 위한 자원 추정치 및 성과지표 수립

CapEx 초기 투자비	OpEx 반복 운영비	KPI 핵심 성과 지표	MVP 최소 운영 패키지
- 가설물 설치 및 초기 인프라 구축 일회성 자본 지출 - 공공·이지스·기업 간 비용 분담 비율 및 자체 조달안 - 투입 대비 장소 가치 상승효과 사전 산정 및 입증	- 인건비, 미화/보안 유지비, 프로그램 운영 고정 지출 - 상시 서비스 운영을 위한 최소 원가 단위 산출 - 자체 수익 모델 기반 지속 가능한 재무 흐름 시뮬레이션	- 방문객 수, 체류 시간, 재방문율 양적 데이터 기준 - 이용자 만족도 및 시민 수용성 질적 데이터 기준 - 목표 미달 또는 치명적 민원 발생 시 적용할 중단 조건	- 예산 제약 반영 가장 작고 날카로운 실행 단위 확정 - 초기 위험 최소화 및 핵심 가설 검증 운영 경계선 설정 - MVP 가동 여부 결정짓는 필수 충족 조건(Go/No-Go)

실제 가설 검증에 필요한 최소한의 자원 구조와 중단 임계값을 선제 수립한다

Milestone 4. 무엇부터 작게 실행할 것인가

MVP 도출 & 최종 실행 준비

실증 범위 정의와 조직별 R&R 확정

최소실증안 MVP의 조직별 실행 범위 확정

	공간솔루션센터	기획추진센터	자산/운영 담당 (AM)	TF 리드
실행 범위	· 운영 일정, 공간 사용, 파트너 관리 현장 총괄	· 플랫폼 구축, 행정/법무/재무 대외 협상	· 물리적 공간의 기저 인프라 통제 및 보호	· 실증 목표 설정, 이해관계 조정, 최종 의사결정
책임 과제	· 참여 기업 역할 확정, 현장 대응 체계 가동	· 서울시 아젠다 관철, 계약/예산 리스크 해소	· 시설물 보호, 보안 통제, 미화, 안전 보험	· 조직 간 인계 수립, 이슈 관리, 예산 집행 승인
산출물	· 현장 운영흐름도, 참여 확인서, 인력 배치안	· 행정 검토서, 공공가치 보고서, 플랫폼 구축	· 시설/안전 점검표, 계약 조건 클리어런스	· 최종 실행안, 의사결정 흐름도, 측정 프레임워크

주체별 명문화된 MVP 최소 조건과 예산, 현장 책임 등 조직별 실행 범위와 책임을 완편한다

현장 실행을 담보하는 MVP 핵심 산출물

계획 및 분장

[산출물 1] MVP 실행안

- 실증 목표, 범위, 대상, 검증 가설 통합 문서

[산출물 2] 이해관계자 업무 분장

- 참여자 간 권한, 책임, 현장 인계 기준 명시

리스크 헷지

[산출물 4] 예산 및 계약 준비안

- CapEx/OpEx 내역, 책임 보험, 시설 보호 협약서

운영 정책

[산출물 3] 현장 운영 흐름 및 정책

- 시간대별 공간 사용 및 이슈 대응 체계(SOP)

측정 및 점검

[산출물 5] 데이터 수집 계획

- 정량/정성 성과 지표 및 데이터 트래킹 방법론

[산출물 6] 실행 준비 체크리스트

- 이륙 직전 4대 주체 교차 검증 최종 승인 항목

현장에서 즉시 구동 가능한 세부 규격으로 구체화하여 장애 없는 실행 환경을 구축한다

가설 검증의 유효성 확보

MVP 현장 투입 전 실행타당성 최종 검증

가설 타당성	책임의 명확성	재무 및 안전 요건	성과 지표 가용성
☐ 설정된 최소 범위 가설이 현장 문제를 해결하기에 논리적으로 타당하게 설계되었는가? ☐ 시민 편익과 자산 가치 상승의 결합 지점이 명확한 인과관계로 설명되는가?	☐ 민간 기업, 입주사, AM, 서울시 간의 역할 및 현장 업무 분장이 겹치지 않는가? ☐ 현장 사고, 악성 민원, 프로그램 실패 시 법적/행정적 책임질 주체가 명시화되었는가?	☐ 추정된 CapEx 및 OpEx 예산이 전액 확보되었으며 파트너 계약 절차가 완료되었는가? ☐ 책임 보험 가입, 시설물 보호 대책, 인허가 등 물리적·법적 방어기제가 작동하는가?	☐ 성공과 실패를 판가름할 사전 정량적 기준값(Baseline)이 명확히 수립되었는가? ☐ 필수 데이터(이용량, 체류시간, 만족도)를 수집하고 저장할 플랫폼 체계가 구비되었는가?

검증 타당성과 법무적 안전 요건을 완벽히 정립한 후 최종 서비스 오픈한다

Milestone 5. 어떻게 작동했으며 무엇을 남겼나

실증 운영 성과 평가 & 노하우의 SBD 전이

이용자 경험 및 O&M 데이터 취합


실증 데이터와 운영 기록을 실시간 전수 수집함

	상시 (Continuous)	정기 (Periodic)	일시 (Ad-hoc)
정량적 경험 (Quantitative Experience)	- 보행 인구 유입량 - 시간대별 유동 트래픽	- 체류 시간 - 구역별 밀집도	- 리테일 매출 - 전환율(Conversion Rate)
정성적 만족 (Qualitative Satisfaction)	- 불편/개선 제안 - 현장 VOC	- 여정 단계별 피드백 - 시설 만족도	- 이벤트별 참여자 심층 인터뷰
현장 O&M (Operations & Maintenance)	- 소음 민원 - 안전/화재 알림	- 미화 청소 주기 - 안전 순찰 빈도	- 돌발 시설 보수 - 긴급 유지보수 출동 건수

현장 가동을 통해 축적된 이용량과 운영 원가 및 사용자 반응을 실시간 데이터 자산으로 변환하여, 후속 사업을 위한 근거로 확보

정성·정량 성과 기준에 입각한 실증 사업 후속 의사결정 프로세스

성과 평가에 기초하여 사업의 보완과 종료를 판정함

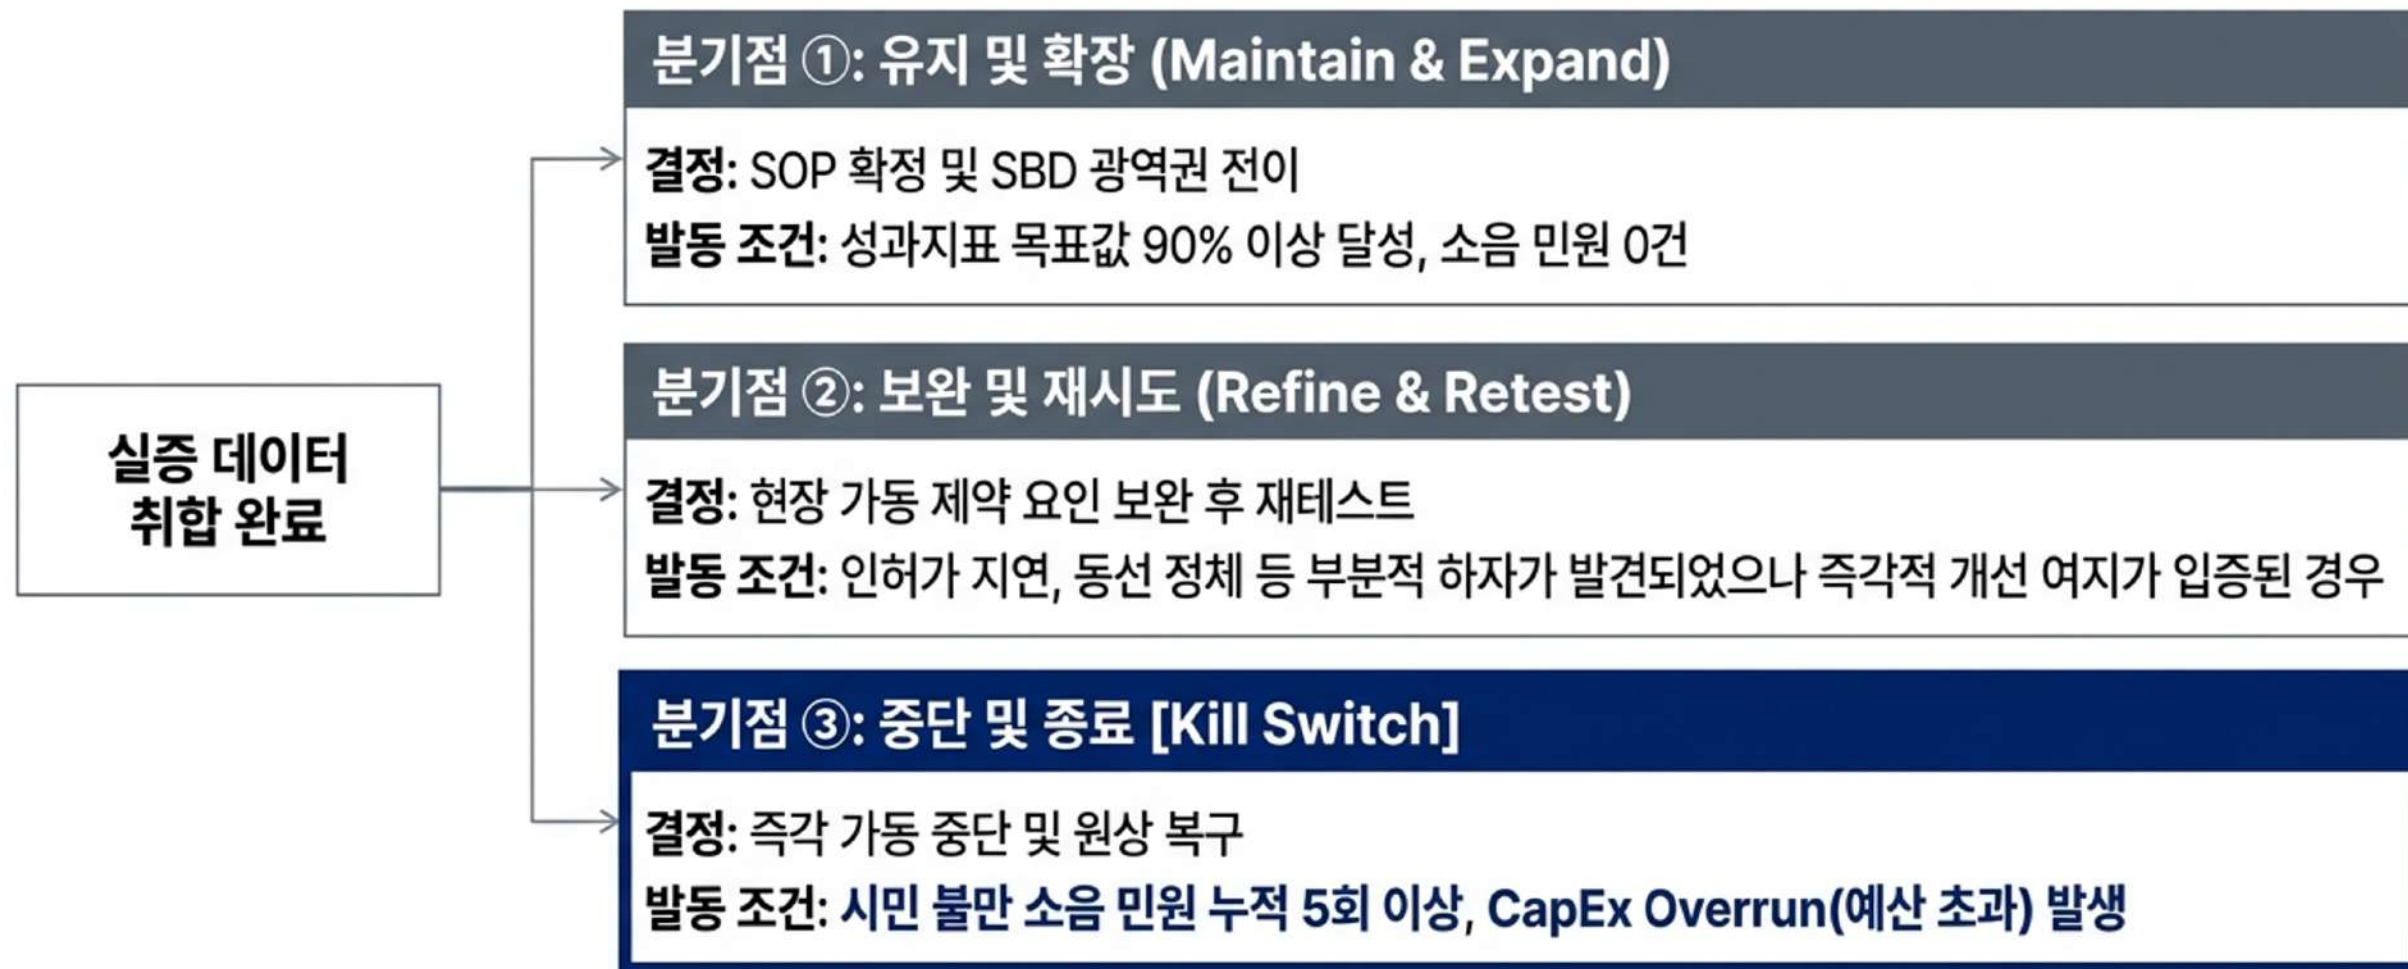

타성적 사업 지속을 배격하고, 정량화된 가설 검증 통과 여부에 기초하여 예산 낭비를 선제적으로 차단하는 통제장치 사전 적용

참여 기업의 조건 확인서와 표준 위탁 계약을 확보함

[기둥 1: 공공 위탁계약 (서울시)]

- 열린송현광장 일대 위탁 관리 물리적 범위 확정
- 서비스수준협약(SLA) 최저 기준선 및 인허가 패스트트랙
- 기본 행정서비스와 민간 추가서비스의 법적 책임 경계 분리

[기둥 2: 민간 참여확약 (참여 기업)]

- 기업 스폰서십 예산 분담 보증 및 현금/현물 출자 확약서 영수
- 브랜드 콘텐츠 및 독점 제공 기술(IP) 라이선스 계약
- 참여 임차사 및 리테일 상권 연계 혜택 보장

[기둥 3: 운영 대행계약 (전문 위탁사)]

- 현장 프로그램 상시 가동 및 시설 O&M 대행 전권 부여
- 안전 사고 및 민원 대응 책임 귀속 (면책 조항 명시)
- SLA 미달 시 **페널티 수치** 및 **계약 해지 트리거** 적용

단순 구두 협조 수준의 협의를 지양하고, **법적 효력을 갖춘 표준 위탁 계약 모델과 서면 합의서**를 확보하여 제도 노하우로 자산화


6대 핵심 평가지표로 사업 타당성을 계량화함

다차원 KPI 평가 매트릭스	① 장소경험 / ② 주체참여	③ 현장운영 / ④ 경제성	⑤ 공공성 / ⑥ 노하우 확보
부동산 단일 임대수익률 지표를 전면 대체함. 권역 전체의 유·무형 통합 효과를 6대 핵심 평가지표(KPI)로 분할하여 교차 검증을 수행함.	- (장소경험) 특정 시간대 공간 이용량 추이, 동선 내 체류 시간 비율 - (주체참여) 파트너 기업 및 인근 상권의 공동 참여도, 제공 자원 실효율	- (현장운영) 계약으로 협약된 SLA(서비스수준협약) 준수율, 민원 종결 리드 타임 - (경제성) 단위 면적 및 참여 인원당 산출된 최소 투입 운영비(OpEx)	- (공공성) 시민 접근 및 개방성 보장 여부, 주변 상권 상생 및 낙수 효과 - (노하우) SBD 등 타 권역에 재사용 가능한 표준 운영 매뉴얼 확보율

단순 부동산 임대수익률 분석이 아니라, 권역 통합 관리가 가져오는 유·무형의 사회적·재무적 효과를 계량적으로 교차 검증함

이용자 경험 및 O&M 데이터 취합

마일스톤과 의사결정 원장을 단일 플랫폼에서 통합관리함

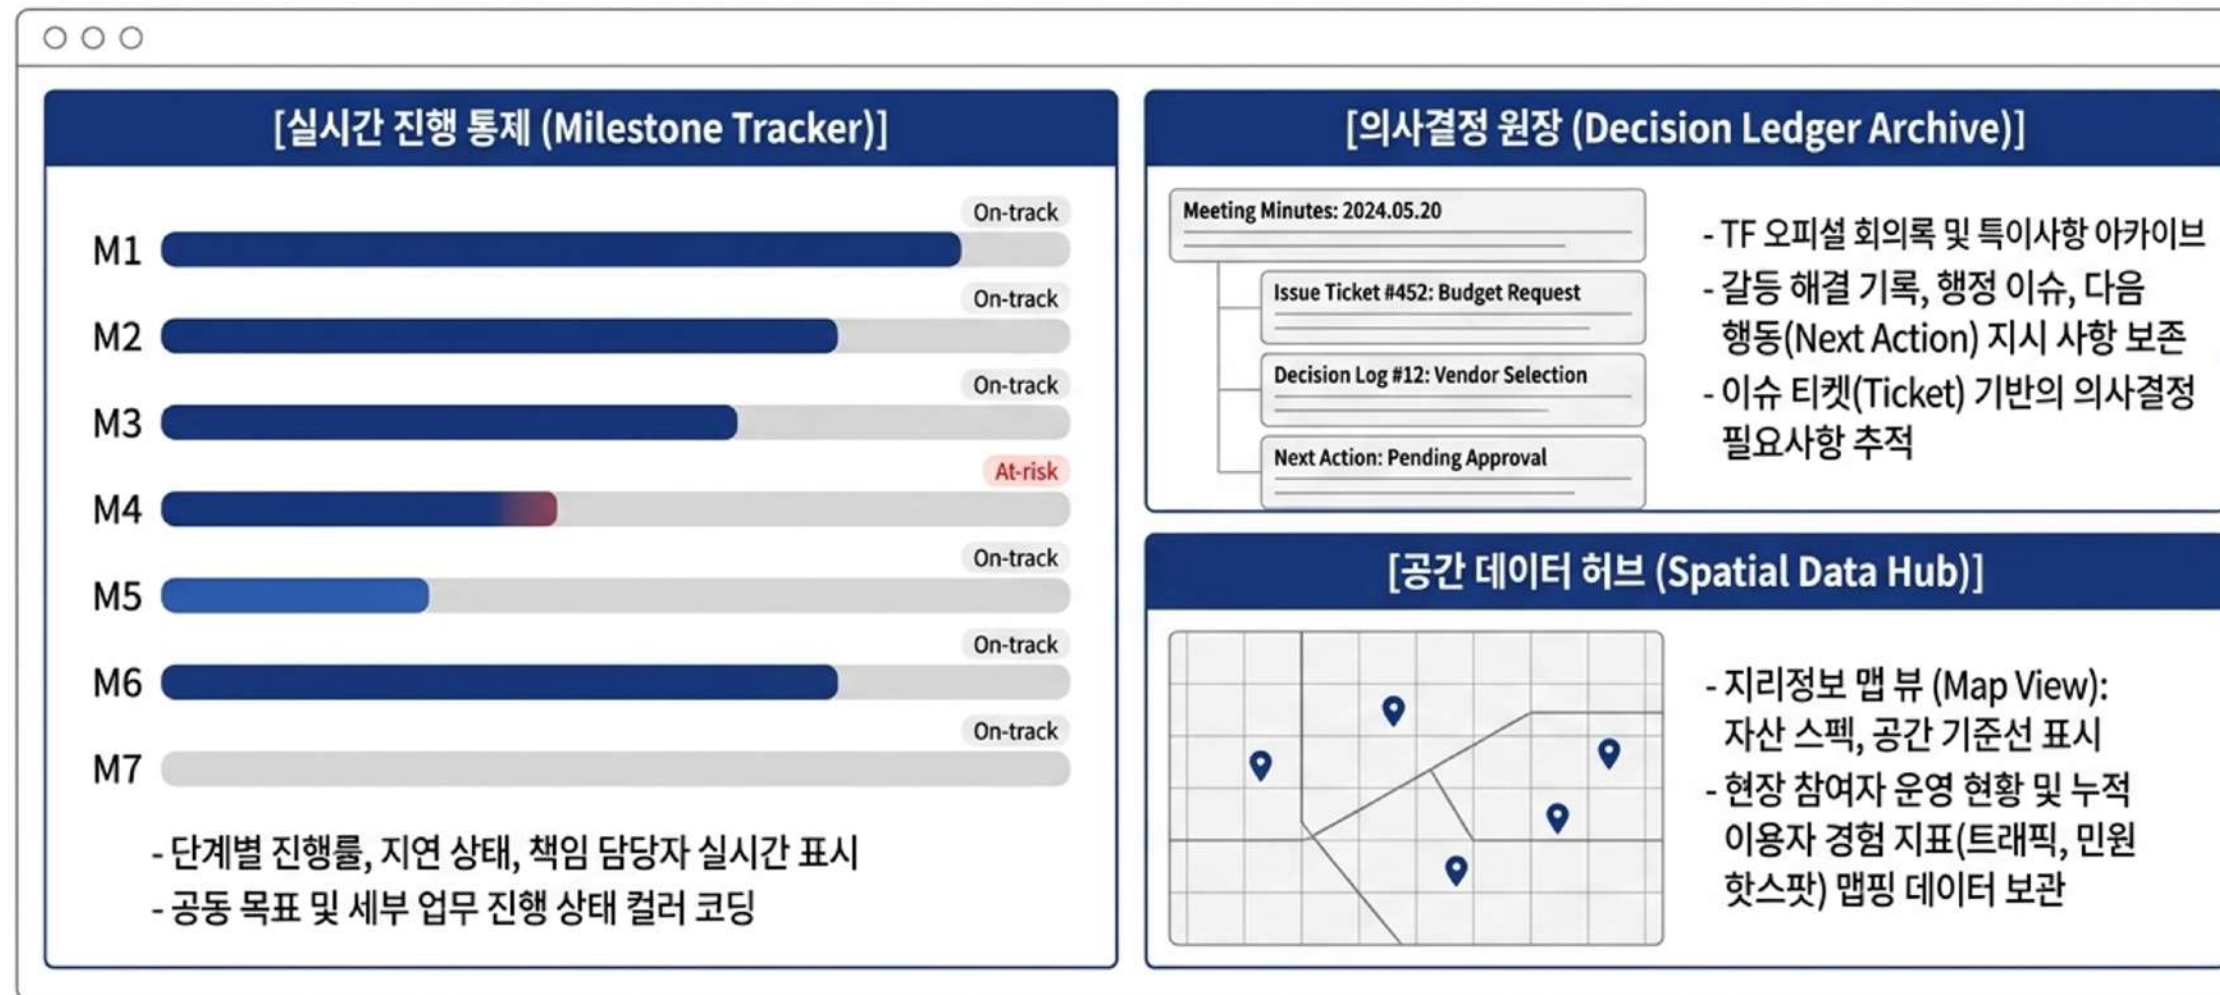

웹사이트는 프로젝트 소개 페이지가 아니라 근거 구축, 책임 과업, 산출물과 마일스톤 진행상태를 통합한 데스크톱 작업공간으로 운영한다

#appendix

주체별 관계도

[협의·의사결정 구조] 외부 협력자의 공식 협의창구와 TF 내부 인계·의사결정 구조


각 외부 주체는 담당 조직과 직접 협의하고, 기업은 최초 접점 이후 실무협의를 공간솔루션센터로 인계되며, 파트너 선정·주요 조건·단계 전환은 송현 BID TF가 최종 결정



*TF 최종 결정 : 실증 가설, 파트너, 참여조건, 예산, KPI, 다음단계

[현장 서비스 전달구조] TF가 방향을 결정하고, 총괄 운영파트너가 서비스를 현장에 구현

공간솔루션센터는 서비스·운영모델 설계와 파트너 협의를 주관하고, 총괄 운영파트너는 인력·일정·안전·품질·원가를 통합하여 이용자에게 서비스를 제공

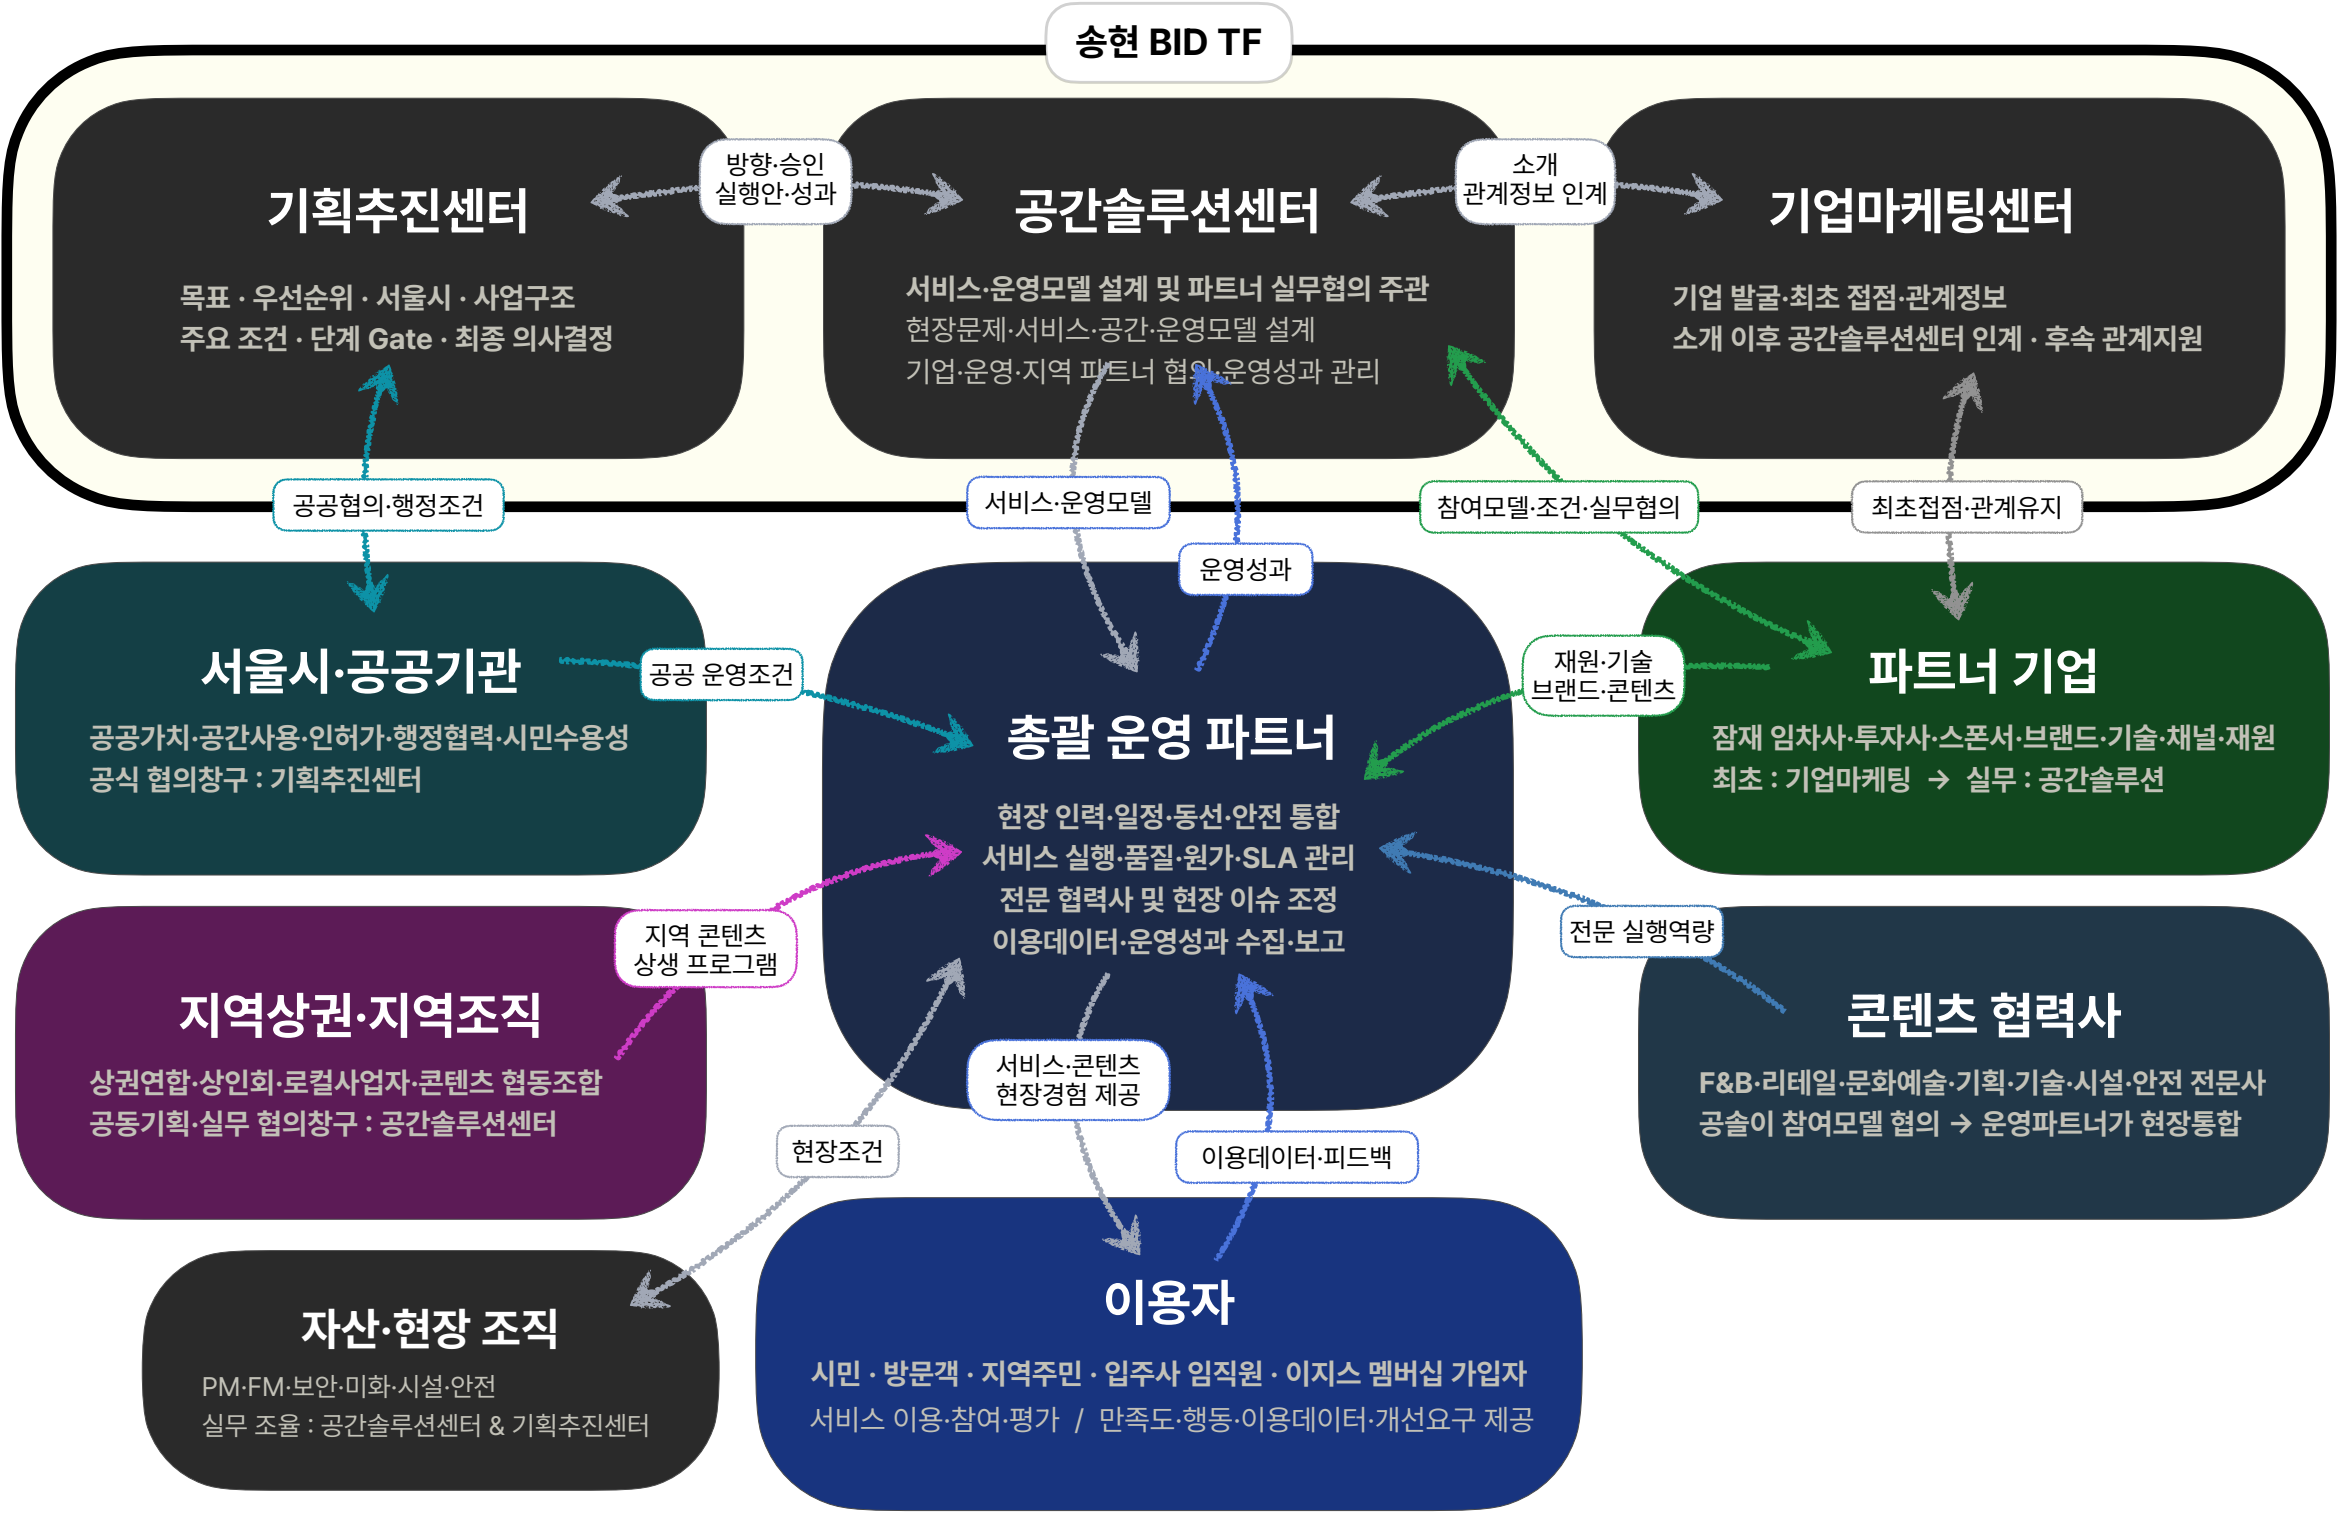

*운영·콘텐츠 파트너와 지역상권이 이용자 경험을 제공하고, 이용데이터와 피드백은 공간솔루션센터를 통해 TF 성과판단으로 귀속

Thank you.
